

ДОГОВОР

ЗА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ

№ А-176 / 17.12.2014

Днес,17.12..... 2014 г. в гр. Брацигово, между подписаните:

ОБЩИНА БРАЦИГОВО, с адрес: област Пазарджик, община Брацигово, град Брацигово, ул. "Атанас Кабов" № 6А, Идентификационен номер BG, представлявана от **Васил Михайлов Гюлеметов – Кмет на Община Брацигово и Търпена Ангелова Лабва – Главен счетоводител**, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

"Тракия –РМ" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив- 4004,ул."Братя Бъкстон"136,тел.032/695030,факс:032/6724 80,Е-mail:office@trakia-rm.com, Идентификационен номер/ЕИК115010446,представявано от **Халина Малецка -Пейчева - Управител**, наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

във връзка с Решение № РДР 23/30.06.2014 г. на Кмета на Община Брацигово , потвърдено с решение номер 14923 от 10.12.2014 г. на ВАС – град София и на основание чл. 41 от Закон за обществените поръчки,

се сключи настоящия договор.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема и се задължава да извърши строително-монтажни работи (наричани по-долу СМР) с предмет: „Реконструкция на път гр. Брацигово – с. Капитан Димитриево, реконструкция на селищна водопроводна мрежа на с. Равногор и реконструкция на водопроводи от подземни каптажи – „Замарница”, „Попски извор”, „Бойков извор”, „Розовски вриз” и „Чобаново” до РШ Розово, община Брацигово, област Пазарджик”,

в съответствие с изискванията на тръжната документация и Приложенията към настоящия договор, представляващи неразделна част от него, включително да извърши при необходимост за своя сметка нужните проби и пускови работи по съответните СМР за въвеждане на обекта в експлоатация и да изготви екзекутивна документация, когато такава следва да се съставя.

(2) Строително-монтажните работи ще се извършват по график, съгласно Приложение № 1, неразделна част от договора.

II. СРОКОВЕ

Чл.2. (1) Срокът за изпълнение на договорените видове СМР е **180** (сто и осемдесет) календарни дни, като етапите за изпълнение са определени в “График за изпълнение на проекта”, който е неразделна част от настоящия договор.

(2) За начало на изпълнението на договорените видове СМР се счита денят на откриване на строителната площадка с Протокол – образец 2а, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за

съставяне на актове и протоколи по време на строително-монтажните работи, а за край на изпълнението – окончателното предаване на обекта от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с подписването на Протокол – образец 15, съгласно изискванията на действащата нормативна уредба за контрол и приемане на СМР. Когато са необходими приемни изпитвания, приемането на обекта се извършва след успешното им провеждане, потвърдено с протокол.

(3) При спиране на строително-монтажните работи по нареждане на общински или държавен орган, срокът по ал.1 съответно се удължава, ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма вина за спирането и подписване на Протокол - обр.10, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строително-монтажните работи.

(4) При спиране на строително-монтажните работи по нареждане на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, поради лоши метеорологични условия или други фактори, които биха довели до некачествено изпълнение на СМР се съставя Протокол - обр.10, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строително-монтажните работи и обекта се предава на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за съхранение, като срокът по ал.1 спира да тече до съставяне на Протокол - обр.11 от Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строително-монтажните работи.

(5) Срокът за изпълнение на договора не може да бъде удължаван, освен в случаите на непреодолима сила, по смисъла и при спазване на разпоредбите на Раздел XI Форсмажорни обстоятелства.

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.3. (1) Цената на този договор е **4 455 848,81** (четири милиона четиристотин петдесет и пет хиляди , осемстотин четиридесет и осем лева и осемдесет и една стотинки) лева без ДДС, **5 347 018,57** (пет милиона ,триста четиридесет и седем хиляди и осемнадесет лева и петдесет и седем стотинки) лева с ДДС, съобразно представеното ценово предложение на Изпълнителя. Така определената цена е окончателна, приета е от страните и не подлежи на увеличение.

(2) Плащането на цената се извършва както следва:

- Авансово плащане - еднократно в размер на **2 227 924,41**(два милиона двеста двадесет и седем хиляди , деветстотин двадесет и четири лева и четиридесет и една стотинки) лева

без ДДС и ДДС в размер на **445 584,88**(четиристотин четиридесет и пет хиляди ,петстотин осемдесет и четири лева и осемдесет и осем стотинки) лева, представляващи 50 % от стойността на договора.

Авансът се изплаща еднократно в срок до 15 (петнадесет) календарни дни от датата на подписване на настоящия договор , получаване на кредит за финансиране на разходите за ДДС по проекта, подписване на Протокол Обр.2а по Наредба № 3 от 31.07.2003 година за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и след представяне на банкова гаранция или друго обезпечение за пълния размер на аванса и издадена фактура съгласно Закона за счетоводството.

- Междинно плащане - дължимо в 15 (петнадесет) дневен срок след представяне на протоколи по Наредба № 3 от 31.07.2003 година за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Основание за извършване на междинното плащане е приет и подписан от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** Акт за извършени и подлежащи на разплащане видове СМР.

Завършени и подлежащи на разплащане се считат актувани с протокол видове СМР, след извършено замерване и приети от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР**.

Междинното плащане се осъществява след представена оригинална фактура в съответствие със Закона за счетоводството. Сумата на междинното плащане се приспада от стойността на договора при окончателното плащане.

- Окончателно плащане – се изплаща от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в срок до 15 (петнадесет) календарни дни след издаване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа при предаването на строежа и строителната документация от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** (образец № 15 съгласно Наредба № 3 от 2003 г.), Протокол за установяване годността за ползване на строежа (образец № 16 съгласно Наредба № 3 от 2003 г.) и получено от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** финансиране. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя оригинална фактура за стойността на окончателното плащане.

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** издава фактура за всяко плащане в съответствие със Закона за счетоводството.

(4) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да посочи в издадените от него фактури номера на настоящия договор, текста: „Разходът е за безвъзмездна помощ по договор с рег. № 13/321/01221 от 12.12.2012 г. на ДФЗ” и наименованието на проекта.

а.) Плащането по настоящия договор ще се извършва по банков път по банковата сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** посочена в представените от него фактури.

(5) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** си запазва правото да замени даден вид строителна работа и заложен материал в процеса на изпълнение на поръчката, без да се променя общата стойност на обекта.

(6) Разходите, извършени във връзка с изпълнението на договора трябва да отговарят на правилата за допустимост съгласно ПМС № 62/21.03.2007 г. и ПМС № 245/09.10.2007 г.

(7) Цената по ал. 1 е за цялостно извършване на СМР, включително цената на вложените материали, извършени работи и разходите за труд, механизация, енергия, опазване и други подобни, както и печалба за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(8) Непредвидените видове и количества работи, възникнали в процеса на изпълнение, се изпълняват само след разрешение от Възложителя и предварително одобрение от Финансиращия орган.

а.) За СМР по ал.10 се съставя протокол подписан от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**, инвеститорския контрол, СН /строителния надзор/, Авторския надзор (Проектант) и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и се представя за одобрение на Финансиращия орган.

б.) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**, не може да иска извършване на дейности по ал. 10, ако увеличението на извършените работи е вследствие на:

- несъгласувано с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и Финансиращия орган отклонение от техническата документация
- нарушаване на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи
- отстраняване на допуснати от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** недостатъци
- влагане на некачествени или неподходящи материали - „Наредба за съществените изменения към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти”

в.) Непредвидени видове нови работи се разплащат въз основа на посочените в офертата параметри на ценообразуване:

- Средна часова ставка.....3.80лв./час
- Допълнителни разходи върху труд.....90 %
- Допълнителни разходи върху механизация.....30 %
- Доставно-складови разходи..... 10 %
- Печалба10.0%



3

IV. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА

Чл. 4. (1) Приемането на извършената работа се извършва с двустранно подписан протокол – Обр. 19, придружен с подробна количествена сметка и представяне на сертификати за качество на материалите.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже да приеме обекта или отделни СМР, ако открие съществени недостатъци.

(3) Недостатъците се отстраняват от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и за негова сметка. До тяхното отстраняване **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** може да задържи плащането на дължимата сума.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.5. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши строително-монтажните работи с грижата на добър стопанин, като спазва предвиденото в техническата документация и изискванията на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи за съответните дейности.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да влага в строително-монтажните работи висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР. Материалите се доставят със сертификат за качество и сертификат за произход.

(3) Разходите за консумация на електроенергия, вода и други консумативи, необходими за изграждане на обекта, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, ако при извършването на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация, или е нарушил императивни разпоредби на нормативните актове.


(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва законовите изисквания, свързани със строително-монтажните работи, включително относно опазването на околната среда и безопасността на строителните работи.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва изискванията на мерките за информация и публичност при изпълнение на дейностите по Мярка 321 «Основни услуги за населението и икономиката в селските райони» от Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г..

(7) Да предостави възможност на Управляващия орган, националните одитиращи власти, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата, Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности – Република България и външните одитори да извършват проверки чрез разглеждане на документацията или чрез проверки на мястото на изпълнение на проекта и да извършват пълен одит, ако е нужно, въз основа на оправдателни документи за отчетеното, счетоводни документи и всякакви други документи, имащи отношение към финансирането на проекта. Такива проверки могат да бъдат извършвани до 3 години след приключване на оперативната програма.

(8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място.

(9) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да докладва за възникнали нередности и поема задължение за възстановяване на суми по нередности, заедно с дължимата лихва и други неправомерно получени средства.

 4

(10) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да информира **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за възникнали проблеми при изпълнение на проекта и за предприетите мерки за тяхното разрешаване.

(11) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да съхранява всички документи по изпълнението на настоящия договор както следва: за период от 5 (пет) години след датата на приключването на дейностите по настоящия договор.

(12) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава при подписване на договора да представи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** копия на застраховки „Професионална отговорност”, съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ и „Трудова злополука”, съгласно Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска "трудова злополука". Същият носи пълна отговорност за евентуални трудови злополуки на Обекта за своите служители, работници, подизпълнители и за трети лица, посещаващи обекта.

(13) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да извършва или да осигурява необходимия контрол по време на изпълнението на работите и след това, докато **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** счита, че е необходимо за надлежното изпълнение задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по договора.

(14) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** поема цялата отговорност за правилното, сигурно и безопасно изпълнение на всички дейности на обекта.

Чл.6. (1) При изпълнение на възложените СМР **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава:

1. Да спазва всички технически нормативни документи, както и правилата по техническа безопасност, хигиена на труда, противопожарна безопасност, за опазване на околната среда и безопасност на движението.

2. Да осигури за своя сметка всички складови и хигиенно битови условия за нормална работа на обекта

3. Да осигури за своя сметка всички необходими съоръжения, нужни за изпълнението на поетите задължения по този договор, както и тяхната поддръжка.

4. Да обезопаси строителната площадка и вътрешността на обекта.

5. Да съгласува всички промени, наложили се по време на строително-монтажните работи, с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да отстранява за своя сметка всички некачествени работи, забелязани по време на строително-монтажните работи или причинени при изпълнението на договорените СМР.

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изготвя своевременно по време на изпълнение на обекта и да подписва всички актове, които се съставят по време на строително-монтажните работи.

(4) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изготви и предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** екзекутивни чертежи за договорените и изпълнени работи, както и да съдейства за издаването на разрешение за ползване, доколкото това е обусловено от негови действия.

(5) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава при изпълнение на задълженията си да работи само с квалифицирани технически ръководители, които са достатъчно компетентни за надлежното и своевременно изпълнение на обекта.

(6) При подписване на договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** гаранция под формата на парична сума или неотменима и безусловна банкова гаранция за добро и качествено изпълнение на работите в размер на 3 % от договорната цена, с възможност да се усвои изцяло или на части в зависимост от претендираното. Гаранцията трябва да съдържа задължение за Банката гарант да извърши безусловно плащане при първо писмено поискване от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не е

изпълнил някое от задълженията си по договора в съответствие с уговореното. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** поема разходите по оформянето и поддържането на указаната гаранция.

(7) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да иска приемане на извършената работа.

(8) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да получи договореното възнаграждение съгласно условията и сроковете, предвидени в настоящия договор.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.7. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да преведе по банковата сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** договореният аванс съгласно чл. 3, ал. 3 от настоящия договор.

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** изпълнените и приети видове СМР, за които има издадена фактура, съгласно условията на настоящия договор.

(3) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** предоставя на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** преди започване на строително-монтажните работи наличната и необходима проектна документация и информация, свързана с възложените СМР.

(4) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигурява за своя сметка свои упълномощени представители (проектанти, инвеститорския контрол, строителен надзор и други).

(5) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да съдейства за изпълнението на договорените СМР, като своевременно решава всички технически проблеми, възникнали в процеса на работата.

(6) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ**, или упълномощени от него физически или юридически лица имат право по всяко време на строително-монтажните работи да посещават обекта или да извършват проверка относно качеството, количеството, сроковете за изпълнение и техническите параметри на възложената по договора работа, без да нарушава оперативната му самостоятелност.

(7) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не участва в трудово-правни и други спорове между **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговия персонал, както и подизпълнителите, които е наел.

(8) Контрола по изпълнението и приемането на строително-монтажните работи се осъществява от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или упълномощени от него представители.

(9) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да откаже приемането на СМР при непълно или неточно изпълнение или съществено забавяне изпълнението на договора.

(10) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да отменя и възлага допълнителни строителни работи в процеса на изпълнението.

VII. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл.8. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършени строително-монтажни работи, конструкции, материали, строителна техника и други материални активи, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** от момента на предоставянето на строителната площадка за изпълнение на СМР.

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** носи риска от погиване или повреждане на вече приетите СМР, освен ако погиването или повреждането е по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.

VIII. ГАРАНЦИИ И ГАРАНЦИОНЕН СРОК

6

Чл.9 (1) Гаранционният срок, който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема за изпълнените видове СМР е съгласно офертата му както следва :**Реконструкция на водопроводи от подземни каптажи – 8 години; Реконструкция на път гр.Брацигово- с.Капитан Димитриево – 3 години; Реконструкция на селищна водопроводна мрежа на с.Равногор- 8 години**, като предложените срокове трябва да са съобразени с разпоредбата на чл.20, ал.3 и ал.4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще представи в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** парична сума или банкова гаранция, съгласно условията на договора.

(3) Гаранцията за добро изпълнение се освобождава от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в едномесечен срок след подписване на приемо-предавателния протокол, удостоверяващ окончателния прием на обекта, предмет на договора при липса на направени възражения и издадено разрешение за ползване.

(4) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** освобождава гаранцията по ал. 2 без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

(5) Освобождаването на гаранцията за добро изпълнение не отменя задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по отстраняване на констатирани забележки в гаранционните срокове, вследствие на некачествено изпълнени СМР. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за констатираните недостатъци.

(6) В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не изпълни поправката или разрушаването на некачествените СМР, то **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да възложи отстраняването на дефекта от друго лице, като ангажира гаранционната отговорност на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(7) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да усвоява дължимите суми за неустойки и обезщетения във връзка с неизпълнение на този договор от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** от гаранцията за добро изпълнение.

(8) При неизпълнение на задължения от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за отстраняване на недостатъци и/или повреди; не отстраняване на явни недостатъци и/или липси, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да усвои от гаранцията за добро изпълнение суми, покриващи отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за неизпълнението. За целта след писмено уведомление до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право сам да състави констативен протокол с описание на недостатъците и/или липсите и тяхната стойност или стойността за отстраняване на повредите. В случай, че стойността им е по-голяма от стойността на гаранцията, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да възстанови разликата до пълната стойност на недостатъците и/или липсите или стойността за отстраняване на повредата в срок от 7 (седем) дни от писменото искане на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(9) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** задържа гаранцията за добро изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд по реда на ГПК. Гаранцията се задържа до окончателното решаване на спора.

IX. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.10. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изпълнение на всички задължения на страните.
2. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.
3. При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа.

7

(2) В случай, че работата бъде спряна по обективни причини, които не могат да се вменят във вина на никоя от страните по договора, то неговото действие се прекратява с двустранен протокол. В този случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** възнаграждение за извършената работа до прекратяване на договора.

(3) Ако стане явно, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще просрочи изпълнението на възложената работа с повече от 30 (тридесет) дни или няма да извърши СМР по уговорения начин и с нужното качество, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да развали договора. В този случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** само стойността на тези работи, които са извършени качествено и могат да му бъдат полезни. За претърпените вреди **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да претендира за обезщетение.

(4) При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 5-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна.

Х. НЕУСТОЙКИ

Чл.11. (1) При забава за завършване и предаване на работите по настоящия договор в уговорените срокове **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 0.1 % (нула цяло и един процент) от общата цена по чл. 3, ал. 1 за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % (десет процента). Забавата се установява с протокол подписан от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и лицето упражняващо независим строителен надзор на обекта.

(2) При виновно некачествено извършване на СМР, освен задължението за отстраняване на дефектите, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи и неустойка в размер на 10 % (десет процента) от стойността на некачествено извършените СМР.

(3) Дължимата неустойка по предходната алинея не лишава **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** от възможността да търси други обезщетения и/или да се възползва от други възможности, предоставени му от закона.

(4) Ако недостатъците, констатирани при приемането на СМР или в гаранционния срок по чл. 9, ал.1 от настоящия договор не бъдат отстранени в договорения срок или при липса на уговорка - в подходящ срок, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи освен неустойката по ал. 2 от настоящия член и неустойка в удвоения размер на разноските за отстраняване на недостатъците.


(5) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** има право, без това да му отнема правото по друг начин на обезщетяване, да се удовлетворява от банкова гаранция за добро изпълнение във всички случаи, описани в Договора и свързани с неустойки и санкции към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(6) Ако **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неоснователно забави плащането на дължимата сума срещу извършени работи, той дължи неустойка в полза на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в размер на законната лихва върху неизплатените суми.

(7) Горните неустойки не лишават изправната страна от правото ѝ да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи съгласно действащото гражданско законодателство.

ХІ. ФОРСМАЖОРНИ СЪБИТИЯ

Чл.12. (1) Страните по настоящия договор не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си при настъпването на форсмажорно събитие. Срокът за изпълнение на задължението се продължава съобразно с периода, през който изпълнението е било спряно от форсмажорното събитие. Клаузата не засяга права или задължения на страните, които са възникнали и са били дължими преди настъпването на форсмажорното събитие.

 8

(2) Страната, която е засегната от форсмажорно събитие, следва в максимално кратък срок след установяване на събитието, да уведоми другата страна и да ѝ представи доказателства за появата, естеството и размера на форсмажорното събитие и оценка на неговите вероятни последици и продължителност. Засегнатата страна периодично предоставя последващи известия за начина, по който форсмажорното събитие спира изпълнението на задълженията ѝ, както и за степента на спиране.

(3) Ако форсмажорно събитие е възпрепятствало **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да осъществи дейностите по настоящия договор, сроковете по договора спират да текат и на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** не може да се търси отговорност за неизпълнение или забава.

(4) Страните не носят отговорност една спрямо друга по отношение на вреди, претърпени като последица от форсмажорно събитие.

(5) През времето, когато изпълнението на задълженията на някоя от страните е възпрепятствано от форсмажорно събитие, за което е дадено известие в съответствие с клаузите на настоящия договор и до отпадане действието на форсмажорното събитие, страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието на форсмажорното събитие и доколкото е възможно, да продължат да изпълняват задълженията си по договора, които не са възпрепятствани от форсмажорното събитие.

(6) Страните възобновяват изпълнението на задълженията си по настоящия договор веднага, щом е възможно след отпадане на форсмажорното събитие.

Чл.13. (1) Форсмажорно събитие (непреодолима сила) по смисъла на този договор е всяко непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния контрол на страните, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението му невъзможно.

(2) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие се е случило вследствие на неположена дължима грижа от страна по настоящия договор или при полагане на дължимата грижа това събитие може да бъде преодоляно.

ХІІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.14. (1) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** ще третираат като конфиденциална всяка информация, получена при и по повод изпълнението на договора. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право без предварителното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма договора или част от него и всякаква информация, свързана с изпълнението му, на когото и да е, освен пред своите служители, заети в дейността по договора. Разкриването на информация пред такъв служител се осъществява само в необходимата степен за целите на изпълнението на договора. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** гарантира конфиденциалност при използването на предоставени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** документи и материали по договора, като не ги предоставя на трети лица.

(2) Правилото по предходната алинея не се прилага по отношение на задължителната информация, която **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** следва да представи на Агенцията за обществени поръчки съобразно реда, предвиден в ЗОП.

(3) Настоящия договор не може да бъде изменен от страните, освен в случаите по чл. 43, ал. 2 и ал. 3 от Закона за обществените поръчки.

Чл.15. (1) Ако при извършване на строително-монтажните работи възникнат препятствия за изпълнение на настоящия договор, всяка от страните е задължена да предприеме всички зависещи от нея разумни мерки за отстраняване на тези препятствия, дори когато тя не носи отговорност за тези препятствия.

(2) Ако при отстраняването на препятствия по предходната алинея страната, която не носи задължение или отговорност за това, е направила разноски, то те трябва да се обезщетят от другата страна.

(3) Когато препятствията са по независещи и от двете страни причини, разноските по отстраняването на препятствията се поемат поравно.

Чл.16. Всички съобщения и уведомления между страните по настоящия договор ще бъдат извършвани в писмена форма като условие за тяхната действителност, която ще се счита спазена, ако същите се доставят на ръка, чрез куриерска служба или се изпратят чрез препоръчана поща с обратна разписка, или по факс на надлежния адрес, посочен в настоящия договор, или на онзи друг адрес, за който всяка страна е уведомила другата при промяна. При промяна на посочените адреси за кореспонденция, всяка страна е длъжна да уведоми незабавно другата страна по договора.

Адреси на страните:

1. за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**: област Пазарджик, община Брацигово, град Брацигово, ул. "Атанас Кабов" № 6А,

2. за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**: гр.Пловдив, ул. "Братя Бъкстон" № 136

Чл.17. Нищожността на някоя клауза от настоящия договор не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.


Чл.18. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на договора се решават по взаимно споразумение между страните. При непостигане на съгласие спорът се отнася за решаване пред компетентния съд по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Чл.19. За всички неуредени с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

Чл.20. Неразделна част от настоящият договор са следните приложения:

1. График за изпълнение на проекта /от офертата/.
2. Техническо предложение на Изпълнителя в процедурата за възлагане на обществена поръчка.
3. Техническа спецификация.
4. Ценовото предложение на Изпълнителя в процедурата за възлагане на обществена поръчка с приложени Количествено-стойностни сметки.
5. Документ за внесена гаранция за добро изпълнение.
6. Копия от застраховки "Професионална отговорност" и „Трудова злополука”.

Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра – един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и влиза в сила от датата на одобрение от Държавен фонд «Земеделие» на проведената процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на път гр. Брацигово – с. Капитан Димитриево, реконструкция на селищна водопроводна мрежа на с. Равногор и реконструкция на водопроводи от подземни каптажи – „Замарница”, „Попски извор”, „Бойков извор”, „Розовски вриз” и „Чобаново” до РШ Розово, община Брацигово, област Пазарджик”, финансиран от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и държавния бюджет на Република България по „Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.”, мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в

 10

селските райони” договор за отпускане на финансова помощ с рег. № 13/321/01221 от 12.12.2012 г., сключен между Община Брацигово и Държавен Фонд „Земеделие”.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

1.
/ Васил Гюлеметов /
Кмет на Община Брацигово

2.
/ Търпена Лабова /
Главен счетоводител


Съгласувал :
Елена Асенова - Василева
юрист на община Брацигово



ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.....
/ Халина Малецка - Пейчева /
Управител



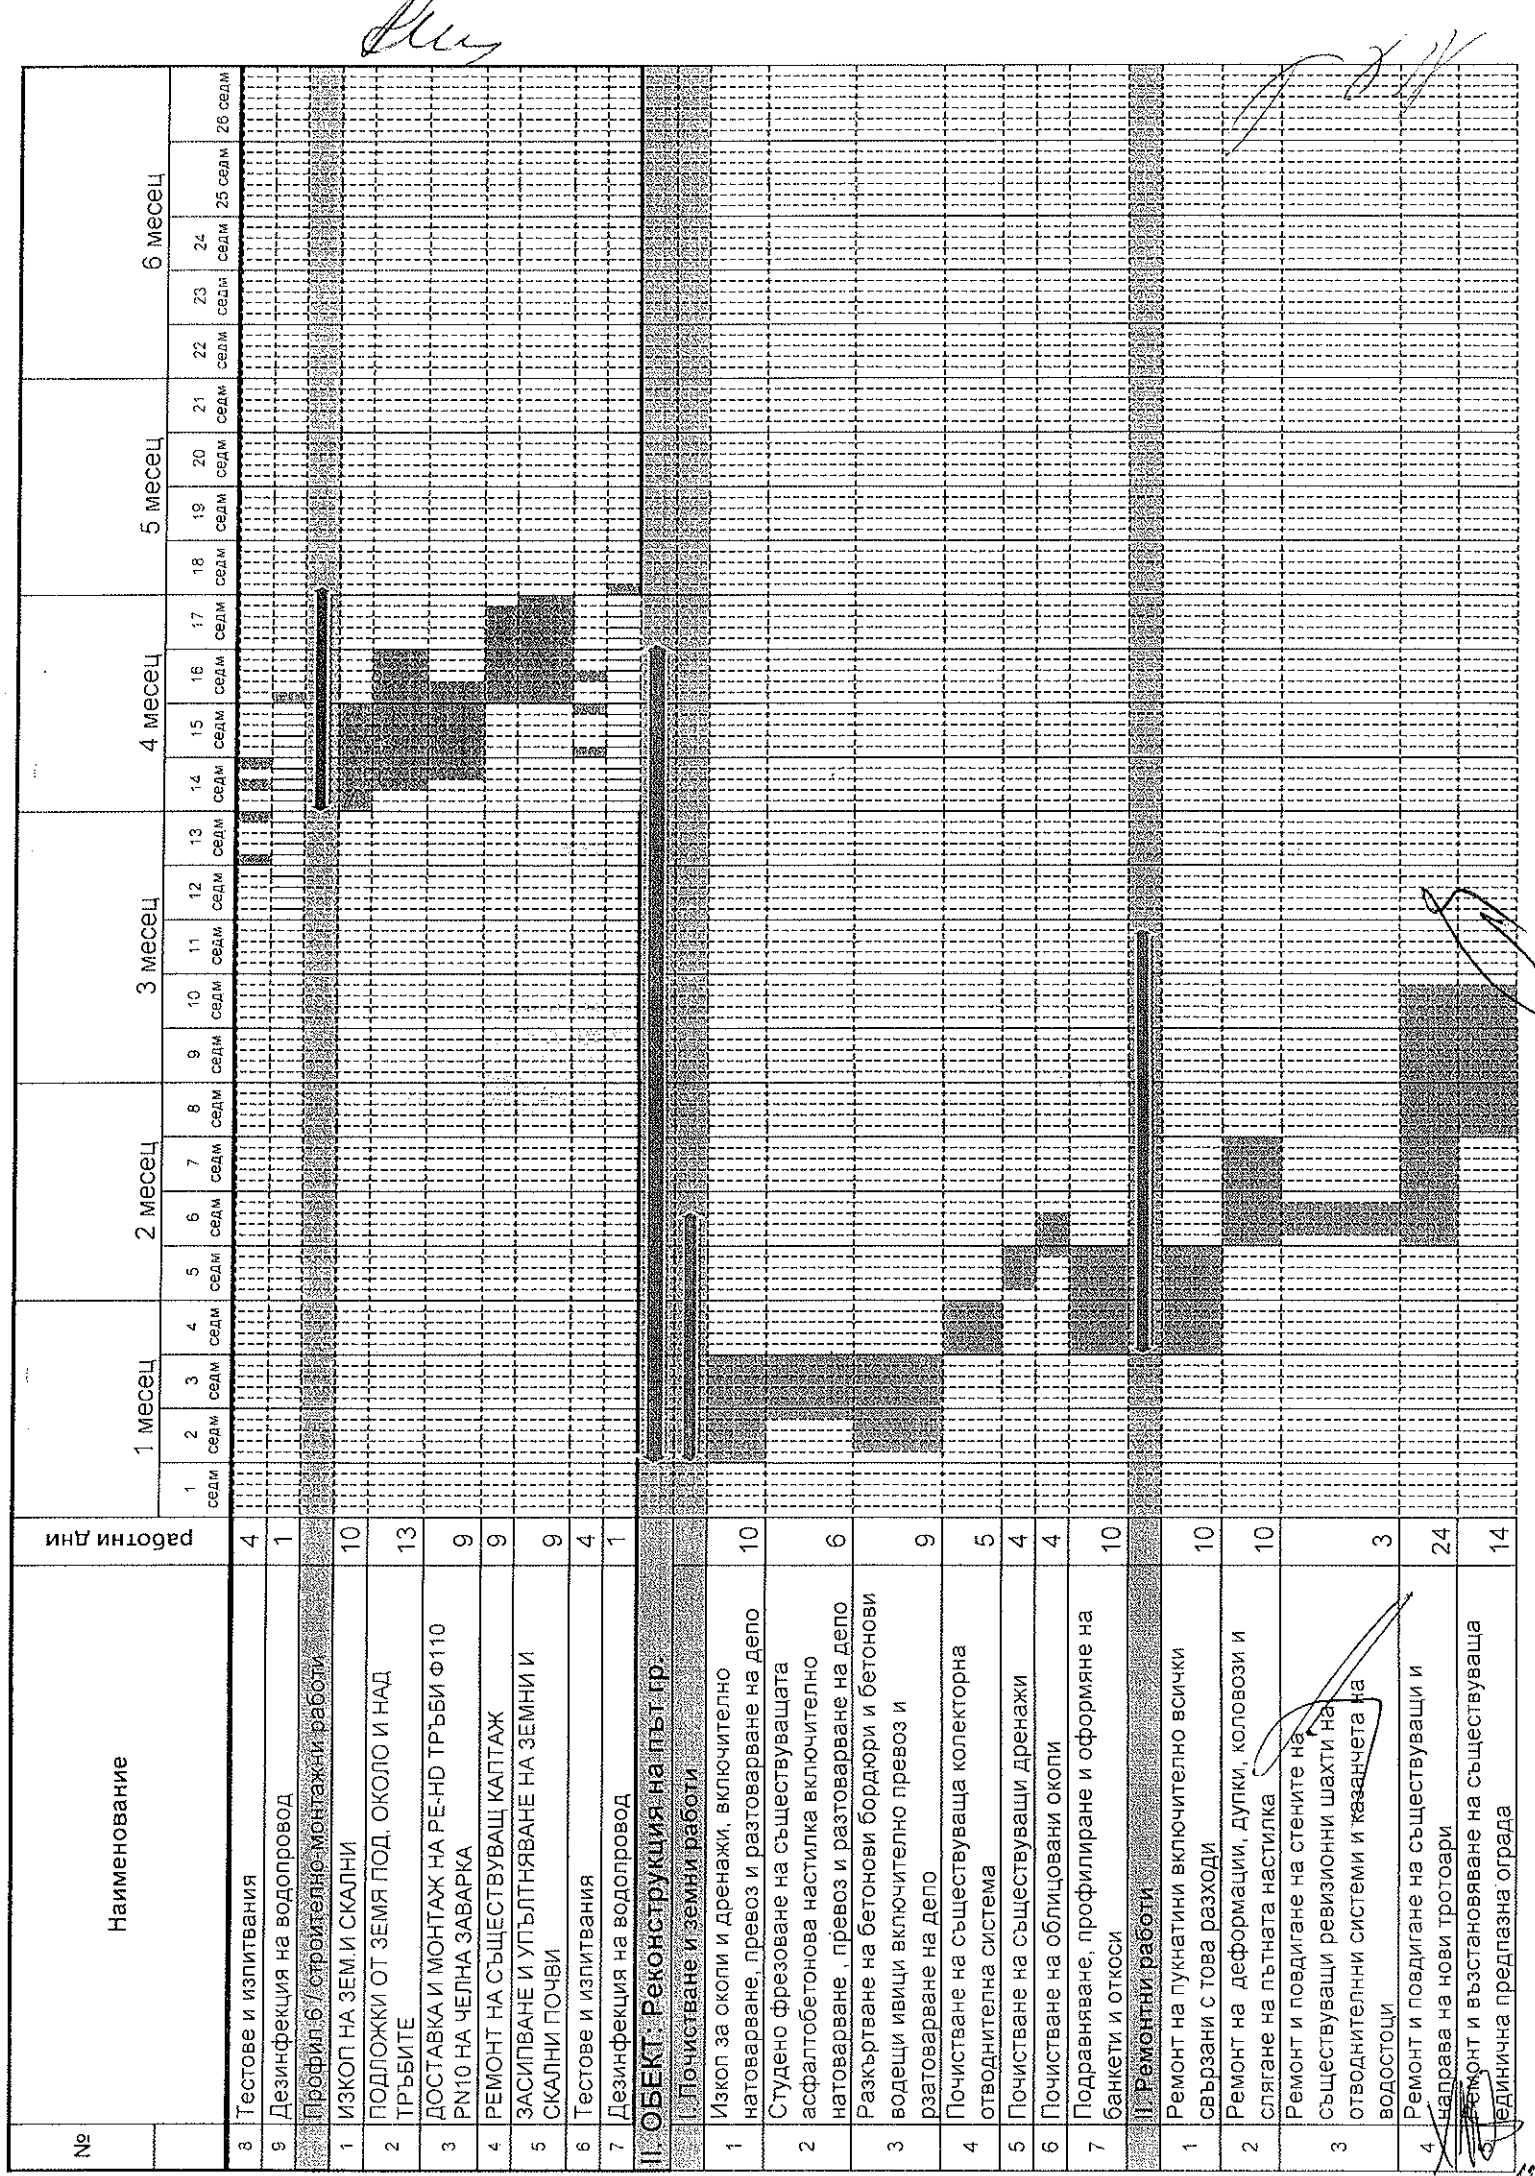

№	Наименование	Работни дни	1 месец							2 месец							3 месец							4 месец							5 месец							6 месец						
			седи	седи	седи	седи	седи	седи	седи	седи	седи	седи	седи	седи	седи	седи	седи	седи	седи	седи	седи	седи	седи	седи	седи	седи	седи	седи	седи	седи	седи	седи	седи	седи	седи	седи	седи	седи	седи	седи	седи	седи	седи	седи

8	Тестове и изпитвания	4	[Gantt bars for Task 8]																								
9	Дезинфекция на водопровод	1	[Gantt bars for Task 9]																								
I. Профил 6 / строително-монтажни работи																											
1	ИЗКОП НА ЗЕМНИ И СКАЛНИ	10	[Gantt bars for Task 1]																								
2	ПОДЛОЖКИ ОТ ЗЕМЯ ПОД ОКОЛО И НАД ТРЪБИТЕ	13	[Gantt bars for Task 2]																								
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЕ-НД ТРЪБИ Φ110 PN10 НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА	9	[Gantt bars for Task 3]																								
4	РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩ КАПТАЖ	9	[Gantt bars for Task 4]																								
5	ЗАСИПВАНЕ И УПЪЛЪНЯВАНЕ НА ЗЕМНИ И СКАЛНИ ПОЧВИ	9	[Gantt bars for Task 5]																								
6	Тестове и изпитвания	4	[Gantt bars for Task 6]																								
7	Дезинфекция на водопровод	1	[Gantt bars for Task 7]																								
II. ОБЕКТ. Реконструкция на път гр. Почистване и земни работи																											
1	Изкоп за окопи и дренажи, включително натоварване, превоз и разтоварване на депо	10	[Gantt bars for Task 1]																								
2	Студено фрезоване на съществуващата асфалтобетонова настилка включително натоварване, превоз и разтоварване на депо	6	[Gantt bars for Task 2]																								
3	Разкъртане на бетонови бордюри и бетонови водещи ивици включително превоз и разтоварване на депо	9	[Gantt bars for Task 3]																								
4	Почистване на съществуваща колекторна отводнителна система	5	[Gantt bars for Task 4]																								
5	Почистване на съществуващи дренажи	4	[Gantt bars for Task 5]																								
6	Почистване на облицовани окопи	4	[Gantt bars for Task 6]																								
7	Подравняване, профилиране и оформяне на банкети и откоси	10	[Gantt bars for Task 7]																								
II. Ремонтни работи																											
1	Ремонт на пукнатини включително всички свързани с това разходи	10	[Gantt bars for Task 1]																								
2	Ремонт на деформации, дупки, коловози и слягане на пътната настилка	10	[Gantt bars for Task 2]																								
3	Ремонт и повдигане на стените на съществуващи ревизионни шахти на отводнителни системи и каналчета на водостоци	3	[Gantt bars for Task 3]																								
4	Ремонт и повдигане на съществуващи и направа на нови тротоари	24	[Gantt bars for Task 4]																								
14	Ремонт и възстановяване на съществуваща единична предпазна ограда	14	[Gantt bars for Task 14]																								

Handwritten signature: *[Signature]*

Handwritten signature/initials

№	Наименование	1 месец							2 месец							3 месец							4 месец							5 месец							6 месец						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31											
6	Второстепенни клонове 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9																																										
8	Второстепенни клонове 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54																																										
7	Второстепенни клонове 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67																																										
9	Второстепенни клонове 10, 11, 12, 13, 14, 73,																																										
10	Възстановяване на асфалтова настилка																																										
11	Тество, изпитвания, проби и дезинфекция																																										

Дата: 19.08.2013

Управител: *[Signature]*
/инж. Халина Малецова-Дойчева



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на път гр. Брацигово – с. Капитан Димитриево, реконструкция на селищна водопроводна мрежа на с. Равногор и реконструкция на водопроводи от подземни каптажи – „Замарница”, „Попски извор”, „Бойков извор”, „Розовски вриз” и „Чобаново” до РШ Розово, община Брацигово, област Пазарджик”

ОБРАЗЕЦ № 20

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от “Тракция – РМ” ЕООД

(наименование на участника)

и подписано от Халина Малецка – Цейчева ЕГН 5610050870

(трите имена и ЕГН)

в качеството му на Управител

(на длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на път гр. Брацигово – с. Капитан Димитриево, реконструкция на селищна водопроводна мрежа на с. Равногор и реконструкция на водопроводи от подземни каптажи – „Замарница”, „Попски извор”, „Бойков извор”, „Розовски вриз” и „Чобаново” до РШ Розово, община Брацигово, област Пазарджик”.

Предлагаме да изпълним предмета на обществената поръчка, съобразно условията на документацията за участие, за цена от **4 455 848.81** /четири милиона, четиристотин петдесет и пет лева, осемстотин четиридесет и осем лева и осемдесет и една стотинки/ без ДДС, формирана от сумата на следните стойности:

Стойност на предвидените СМР **4 243 665.53** /четири милиона двеста четиридесет и три хиляди шестстотин шестдесет и пет лева и петдесет и три стотинки/ без ДДС

Стойност на непредвидените работи **212 183.28** /двеста и дванадесет хиляди сто осемдесет и три лева и двадесет и осем стотинки/ без ДДС

Предлагаме следните ценообразуващи показатели:

-- Средна часова ставка	3,80 лв./час;
-- Допълнителни разходи за труд	90%
-- Допълнителни разходи върху механизация	30%
-- Доставно-складови разходи	10%
-- Печалба	10%

Посочената цена включва всички разходи по изпълнение на обекта на поръчката, в това число и разходите за отстраняване на всякакви дефекти до изтичане на гаранционните срокове и не подлежи на увеличение.

Предложената цена е определена при пълно съответствие с условията от документацията за участие в процедурата.

При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, общата цена ще бъде приведена в съответствие с единичната цена на предложението.

Приложение:

1. Количествено-стойностна сметка, попълнена съгласно образец от документацията за участие
2. Анализи на единичните цени, предложени в КСС.

Дата, 12.08.2013г.


ПОДПИС И ПЕЧАТ:



Количествено - стойностна сметка

I. ОБЕКТ: Реконструкция на водопроводи от подземни каптажи – „Замарица”, „Попски извор”, „Бойков извор”, „Розовски врз” и „Чобаново” до РШ „Розово”

№	Наименование	Мерна единица	Количество	Единична цена	Стойност
1	2	3	4.00	5.00	
	Профил 1 / строително-монтажни работи				
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ОТВАЛА <<01-04-024>>	м3	696.00	4.78	3.326.88
2	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 2 УТ.У-ВИЯ НА ОТВАЛА <<01-04-025>>	м3	348.00	5.38	1.872.24
3	ИЗКОПИ С В>1.2М Н=или<2М В СРЕДНИ СКАЛНИ ПОЧВИ <<01-03-069>>	м3	347.00	76.97	26.708.59
4	НАТОВАРВАНЕ РАЗГЪРМЯНА СКАЛНА МАСА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-033>>	м3	388.64	5.88	2.285.20
5	Транспорт на излишни скални маси на 5км	м3	388.64	1.81	703.44
6	ПОДЛОЖКИ ОТ ЗЕМЯ ПОД, ОКОЛО И НАД ТРЪБИТЕ	м3	420.00	34.02	14.288.40
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЕ-НО ТРЪБИ Ф 280 ММ РН 10 НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА <<09-50-074>>	м	680.00	109.24	74.283.20
8	ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪБИРАТЕЛНА ШАХТА ПО ДЕТАЙЛ	бр.	1.00	4994.92	4.994.92
9	М-Ж РАМКА С КАПАК	бр.	1.00	172.52	172.52
10	ШАХТА ЗА ОТТОК И ВЪЗДУШНИК 100/100СМ Н=или<2М	бр.	5.00	595.22	2.976.10
11	МОНТАЖ НА ЧИЛ ПО ПЛАВОС Ф200ММ	бр.	1.00	6530.22	6.530.22
12	Доставка и монтаж на мрежест филтър ф200	бр.	1.00	528.85	528.85
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО 280/22 НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА	бр.	4.00	196.98	787.92
14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО 280/60 НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА	бр.	1.00	250.81	250.81
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО 280/45 НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА	бр.	1.00	238.30	238.30
16	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО 280/90 НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА	бр.	1.00	345.28	345.28
17	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО 280/11 НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА	бр.	6.00	163.14	978.84
18	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО 280/25 НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА	бр.	2.00	264.98	529.96
19	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО 280/30 НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА	бр.	3.00	196.98	590.94
20	Полагане на детекторна лента и сигнална лента	м	680.00	0.65	442.00
21	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СГ. ФЛАНЕЦ Ф250 <<09-46-004>>	бр.	1.00	72.31	72.31
22	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРЕДФЛАНШОВА ВРЪЗКА И ПРИСЪЕДИНЕТИЛЕН ФЛАНЕЦ Ф280 <<09-50-095>>	бр.	7.00	276.86	1.938.02
23	МОНТАЖ СК С ПРЕДП.ГАРНИТУРА ф80ММ	бр.	5.00	204.45	1.022.25
24	МОНТАЖ ВЪЗДУШНИК ВНВ ф80ММ	бр.	2.00	214.11	428.22
25	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СГ. ФЛАНЕЦ Ф80 <<09-46-002>>	бр.	11.00	33.69	370.59
26	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СГ. ТРОЙНИК 250/80 <<09-23-006>>	бр.	5.00	621.70	3.108.50
27	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЖАБА КЛАПА ф80ММ	бр.	3.00	112.35	337.05
28	Дост. п м-ж на опорен бетонен блок	бр.	4.00	21.71	86.84
29	Изпитване плътността на водопровода	м	680.00	1.99	1.353.20
30	Дезинфекция на водопровод	м	680.00	0.25	170.00
31	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБ. ДО 40 М. ПРИ УТ.У-ВИЯ <<01-04-067>>	м3	837.00	2.16	1.807.92
32	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>>	м3	93.00	6.75	627.75
33	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ <<01-01-061>>	м3	930.00	3.27	3.041.10

3.041.10


Профил 2 / строително-монтажни работи					
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ОТВАЛА <<01-04-024>>	м3	685.00	4.78	3,274.30
2	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 2 УТ.У-ВИЯ НА ОТВАЛА <<01-04-025>>	м3	343.00	5.38	1,845.34
3	ИЗКОПИ С В>1.2М Н=или<2М В СРЕДНИ СКАЛНИ ПОЧВИ <<01-03-069>>	м3	342.00	76.97	26,323.74
4	НАТОВАРВАНЕ РАЗГЪРМЯНА СКАЛНА МАСА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-033>>	м3	383.04	5.88	2,252.28
5	Транспорт на излишни скални маси на 5км	м3	383.04	1.81	693.30
6	ПОДЛОЖКИ ОТ ЗЕМЯ ПОД, ОКОЛО И НАД ТРЪБИТЕ	м3	384.00	34.02	13,063.68
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЕ-НД ТРЪБИ Ф 140 PN 10 НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА <<09-50-068>>	м	731.00	26.83	19,612.73
8	РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩ КАПТАЖ	бр.	1.00	467.09	467.09
10	ШАХТА ЗА ОТТОК И ВЪЗДУШНИК 100/100СМ Н=или<2М	бр.	1.00	595.22	595.22
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО 140/22 <<09-50-089>>	бр.	1.00	117.43	117.43
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО 140/60 <<09-50-089>>	бр.	1.00	117.43	117.43
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО 140/45 <<09-50-089>>	бр.	1.00	151.62	151.62
14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО 140/30 <<09-50-089>>	бр.	1.00	117.43	117.43
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО 140/11 <<09-50-089>>	бр.	1.00	117.43	117.43
16	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СГ. ФЛАНЕЦ 125 <<09-46-003>>	бр.	2.00	42.84	85.68
17	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРЕДФЛАНШОВА ВРЪЗКА И ПРИСЪЕД. ФЛАНЕЦ Ф140 <<09-50-089>>	бр.	4.00	108.38	433.52
18	МОНТАЖ СК С ПРЕДП.ГАРНИТУРА ф80ММ	бр.	1.00	204.45	204.45
19	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СГ. ФЛАНЕЦ Ф80 <<09-46-002>>	бр.	2.00	33.69	67.38
20	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЖАБА КЛАПА ф80ММ	бр.	1.00	112.35	112.35
21	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СГ. ТРОЙНИК 125/80 <<09-23-006>>	бр.	1.00	145.64	145.64
22	Дост. и м-ж на опорен бетомен блок	бр.	3.00	21.71	65.13
23	Дезинфекция на водопровод	м.	731.00	0.25	182.75
24	Изпитване плътността на водопровода	м	731.00	1.99	1,454.69
25	Полагане на детекторна лента и сигнална лента	м	731.00	0.65	475.15
26	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБ. ДО 40 М. ПРИ УТ.У-ВИЯ <<01-04-067>>	м3	878.00	2.16	1,896.48
27	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>>	м3	98.00	6.75	661.50
28	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ <<01-01-061>>	м3	976.00	3.27	3,191.52
Профил 3 / строително-монтажни работи					
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ОТВАЛА <<01-04-024>>	м3	1,260.00	4.78	6,022.80
2	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ ПОВЕЧЕ ОТ 2 УТ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ <<01-04-026>>	м3	630.00	5.81	3,660.30
3	ИЗКОПИ С В>1.2М Н=или<2М В СРЕДНИ СКАЛНИ ПОЧВИ <<01-03-069>>	м3	629.00	76.97	48,414.13
4	НАТОВАРВАНЕ РАЗГЪРМЯНА СКАЛНА МАСА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-033>>	м3	704.48	5.88	4,142.34
5	Транспорт на излишни скални маси на 5км	м3	704.48	1.81	1,275.11
6	ПОДЛОЖКИ ОТ ЗЕМЯ ПОД, ОКОЛО И НАД ТРЪБИТЕ	м3	689.00	34.02	23,439.78
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЕ-НД ТРЪБИ Ф 125 PN 10 НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА <<09-50-067>>	м	1,344.00	23.02	30,938.88
8	РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩ КАПТАЖ	бр.	1.00	467.09	467.09
10	ШАХТА ЗА ОТТОК И ВЪЗДУШНИК 100/100СМ Н=или<2М	бр.	3.00	595.22	1,785.66
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО Ф125/22 <<09-50-088>>	бр.	6.00	87.60	525.60
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО Ф125/60 <<09-50-088>>	бр.	2.00	100.01	200.02
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО Ф125/45 <<09-50-088>>	бр.	3.00	100.01	300.03
14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО Ф125/25 <<09-50-088>>	бр.	3.00	87.60	262.80
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО Ф125/30 <<09-50-088>>	бр.	7.00	87.60	613.20
16	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО Ф125/11 <<09-50-088>>	бр.	1.00	87.60	87.60
17	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СГ. ФЛАНЕЦ 125 <<09-46-003>>	бр.	2.00	42.84	85.68
18	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРЕДФЛАНШОВА ВРЪЗКА И ПРИСЪЕД. ФЛАНЕЦ Ф125 <<09-50-088>>	бр.	6.00	104.79	628.74
19	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СГ. ФЛАНЕЦ Ф80 <<09-46-002>>	бр.	5.00	33.69	168.45

Handwritten signature and number 4.

20	МОНТАЖ СК С ПРЕДН.ГАРНИТУРА ф80ММ	бр.	2.00	204.45	408.90
21	МОНТАЖ ВЪЗДУШНИК ВНВ ф50ММ	бр.	1.00	214.11	214.11
22	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЖАБА КЛАПА ф80ММ	бр.	1.00	112.35	112.35
23	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТ. ТРОЙНИК 125/80 И 125/50 <<09-23-006>>	бр.	2.00	145.64	291.28
24	Дост. н м-ж на опорен бетонен блок	бр.	4.00	21.71	86.84
25	Дезинфекция на водопровод	м	1,344.00	0.25	336.00
26	Изпитване плътността на водопровода	м	1,344.00	1.99	2,674.56
27	Полагане на детекторна лента и сигнална лента	м	1,344.00	0.65	873.60
28	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБ. ДО 40 М. ПРИ УТ.У-ВИЯ <<01-04-067>>	м3	1,633.00	2.16	3,527.28
29	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>>	м3	181.00	6.75	1,221.75
30	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ <<01-01-061>>	м3	1,814.00	3.27	5,931.78
Профил 4 / строително-монтажни работи					
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ОТВАЛА <<01-04-024>>	м3	1,078.00	4.78	5,152.84
2	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ ПОВЕЧЕ ОТ 2 УТ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ <<01-04-026>>	м3	539.00	5.81	3,131.59
3	ИЗКОПИ С В>1.2М Н=или<2М В СРЕДНИ СКАЛНИ ПОЧВИ <<01-03-069>>	м3	538.00	76.97	41,409.86
4	НАТОВАРВАНЕ РАЗГЪРМЯНА СКАЛНА МАСА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-033>>	м3	602.56	5.88	3,543.05
5	Транспорт на излешни скални маси на 5км	м3	602.56	1.81	1,090.63
6	ПОДЛОЖКИ ОТ ЗЕМЯ ПОД, ОКОЛО И НАД ТРЪБИТЕ	м3	624.00	34.02	21,228.48
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЕ-НД ТРЪБИ Ф 200 PN 10 НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА <<09-50-071>>	м	805.00	71.27	57,372.35
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЕ-НД ТРЪБИ Ф90 PN10 НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА <<09-50-065>>	м	345.00	12.84	4,429.80
10	РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩ КАПТАЖ	бр.	1.00	467.09	467.09
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО Ф200/22 <<09-50-092>>	бр.	3.00	128.02	384.06
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО Ф200/30 <<09-50-092>>	бр.	1.00	128.02	128.02
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРЕДФЛАНШОВА ВРЪЗКА И ПРИСЪЕД. ФЛАНЕЦ Ф200 <<09-50-092>>	бр.	2.00	158.59	317.18
14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТ. ФЛАНЕЦ Ф200 <<09-46-003>>	бр.	2.00	62.63	125.26
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО Ф90/35 <<09-50-086>>	бр.	1.00	56.19	56.19
16	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО Ф90/45 <<09-50-086>>	бр.	1.00	54.22	54.22
17	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО Ф90/30 <<09-50-086>>	бр.	1.00	56.19	56.19
18	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО Ф90/22 <<09-50-086>>	бр.	1.00	62.72	62.72
19	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРЕДФЛАНШОВА ВРЪЗКА И ПРИСЪЕД. ФЛАНЕЦ Ф90 <<09-50-086>>	бр.	1.00	60.01	60.01
20	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТ. ФЛАНЕЦ Ф89 <<09-46-002>>	бр.	1.00	44.53	44.53
21	Дезинфекция на водопровод	м	1,150.00	0.25	287.50
22	Изпитване плътността на водопровода	м	1,150.00	1.99	2,288.50
23	Полагане на детекторна лента и сигнална лента и сигнална лента	м	1,150.00	0.65	747.50
24	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБ. ДО 40 М. ПРИ УТ.У-ВИЯ <<01-04-067>>	м3	1,353.00	2.16	2,922.48
25	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>>	м3	150.00	6.75	1,012.50
26	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ <<01-01-061>>	м3	1,504.00	3.27	4,918.08
Профил 5 / строително-монтажни работи					
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ОТВАЛА <<01-04-024>>	м3	728.00	4.78	3,479.84
2	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 2 УТ.У-ВИЯ НА ОТВАЛА <<01-04-025>>	м3	364.00	5.38	1,958.32
3	ИЗКОПИ С В>1.2М Н=или<2М В СРЕДНИ СКАЛНИ ПОЧВИ <<01-03-069>>	м3	364.00	76.97	28,017.08
4	НАТОВАРВАНЕ РАЗГЪРМЯНА СКАЛНА МАСА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-033>>	м3	407.68	5.88	2,397.16
5	Транспорт на излешни скални маси на 5км	м3	407.68	1.81	737.90
6	ПОДЛОЖКИ ОТ ЗЕМЯ ПОД, ОКОЛО И НАД ТРЪБИТЕ	м3	423.50	34.02	14,407.47
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЕ-НД ТРЪБИ Ф 140 PN 10 НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА <<09-50-068>>	м	290.00	26.83	7,780.70

Handwritten signature or mark.

8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЕ-НД ТРЪБИ Ф160 PN10 НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА <<09-50-069>>	м	513.00	45.12	23.146.56
9	РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩ КАПТАЖ	бр.	1.00	467.09	467.09
10	ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪБИРАТЕЛНА ШАХТА ПО ДЕТАЙЛ	бр.	1.00	4994.92	4,994.92
11	М-Ж РАМКА С КАПАК	бр.	1.00	172.52	172.52
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО 140/22 <<09-50-089>>	бр.	2.00	117.43	234.86
13	МОНТАЖ ВЕНТИЛ ПОПЛАВОК Ф150ММ	бр.	1.00	4471.71	4.471.71
14	Доставка и монтаж на мрежест филтър Ф150	бр.	1.00	340.05	340.05
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО 140/60 <<09-50-089>>	бр.	1.00	117.43	117.43
16	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО 140/45 <<09-50-089>>	бр.	2.00	151.62	303.24
17	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СГ. ФЛАНЕЦ 125 <<09-46-003>>	бр.	1.00	42.84	42.84
18	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРЕДФЛАНШОВА ВРЪЗКА И ПРИСЪЕД. ФЛАНЕЦ Ф140 <<09-50-089>>	бр.	2.00	108.38	216.76
19	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СГ. ФЛАНЕЦ Ф 150 <<09-46-003>>	бр.	3.00	47.44	142.32
20	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРЕДФЛАНШОВА ВРЪЗКА И ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ Ф 160 ММ <<09-50-090>>	бр.	2.00	119.48	238.96
21	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО Ф160/22 <<09-50-090>>	бр.	3.00	94.55	283.65
22	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО Ф 160/15 <<09-50-090>>	бр.	3.00	90.42	271.26
23	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО Ф 160/25 <<09-50-090>>	бр.	1.00	93.26	93.26
24	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО Ф 160/15 <<09-50-090>>	бр.	3.00	90.42	271.26
25	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО Ф 160/30 <<09-50-090>>	бр.	2.00	94.11	188.22
26	Дост. и м-ж на опорен бетонен блок	бр.	2.00	21.71	43.42
27	Полагане на детекторна лента и сигнална лента	м	803.00	0.65	521.95
28	Дезинфекция на водопровод	м	803.00	0.25	200.75
29	Изпитване плътността на водопровода	м	803.00	1.99	1,597.97
30	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБ. ДО 40 М. ПРИ УГ.У-ВИЯ <<01-04-067>>	м3	911.65	2.16	1,969.16
31	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>>	м3	101.00	6.75	681.75
32	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ <<01-01-061>>	м3	1,013.00	3.27	3,312.51
Профили 67 с променливи монтажни работи					
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ОТВАЛА <<01-04-024>>	м3	843.00	4.78	4,029.54
2	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 2 УТ.У-ВИЯ НА ОТВАЛА <<01-04-025>>	м3	422.00	5.38	2,270.36
3	ИЗКОПИ С В>1.2М Н=или<2М В СРЕДНИ СКАЛНИ ПОЧВИ <<01-03-069>>	м3	421.00	76.97	32,404.37
4	НАТОВАРВАНЕ РАЗГЪРМЯНА СКАЛНА МАСА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-033>>	м3	471.52	5.88	2,772.54
5	Транспорт на излишни скални маси на 5км	м3	471.52	1.81	853.45
6	ПОДЛОЖКИ ОТ ЗЕМЯ ПОД. ОКОЛО И НАД ТРЪБИТЕ	м3	362.00	34.02	12,315.24
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЕ-НД ТРЪБИ Ф110 PN10 НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА <<09-50-066>>	м	723.00	16.26	11,755.98
8	РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩ КАПТАЖ	бр.	1.00	467.09	467.09
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО Ф110/15 <<09-50-087>>	бр.	2.00	72.25	144.50
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО Ф110/30 <<09-50-087>>	бр.	4.00	72.25	289.00
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО Ф110/45 <<09-50-087>>	бр.	1.00	77.02	77.02
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО Ф110/60 <<09-50-087>>	бр.	1.00	82.30	82.30
14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СГ. ФЛАНЕЦ Ф100 <<09-46-002>>	бр.	2.00	34.11	68.22
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРЕДФЛАНШОВА ВРЪЗКА И ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ Ф110 <<09-50-087>>	бр.	2.00	81.32	162.64
16	Дезинфекция на водопровод	м	723.00	0.25	180.75
17	Изпитване плътността на водопровода	м	723.00	1.99	1,438.77
18	Полагане на детекторна лента и сигнална лента	м	723.00	0.65	469.95
19	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБ. ДО 40 М. ПРИ УГ.У-ВИЯ <<01-04-067>>	м3	1,186.00	2.16	2,561.76
20	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>>	м3	132.00	6.75	891.00
21	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ <<01-01-061>>	м3	1,317.00	3.27	4,306.59

XAB 6

I. ОБЕКТ: Реконструкция на водопроводи от подземни каптажи – „Замарица”, „Попски извор”, „Бойков извор”, „Розовски вриз” и „Чобаново” до РЩ „Розово”					705,554.88
II. ОБЕКТ: Реконструкция на път гр. Брацигово - с. Капитан Димитриево					
E. Почистване и земни работи					
1	Изкоп за окопи и дренажи, включително натоварване, превоз и разтоварване на депо	м ³	336.60	7.09	2.386.49
2	Студено фрезозване на съществуващата асфалтобетонна настилка включително натоварване, превоз и разтоварване на депо	м ³	8.25	37.07	305.83
3	Разкъртване на бетонови бордюри и бетонови водещи ивици включително превоз и разтоварване на депо	м	330.00	7.03	2.319.90
4	Почистване на съществуваща колекторна отводнителна система	м	141.90	16.77	2.379.66
5	Почистване на съществуващи дренажи	м	56.10	12.32	691.15
6	Почистване на облицовани окопи	м	108.90	14.70	1.600.83
7	Подравняване, профилиране и оформяне на банкети и откоси	м ²	643.50	15.19	9.774.77
II. Ремонтни работи					
1	Ремонт на пукнатини с широчина до 5 мм, включително всички свързани с това разходи	м ²	891.00	19.02	16.946.82
2	Ремонт на пукнатини с широчина над 5 мм, включително всички свързани с това разходи	м ²	379.50	25.02	9.495.09
3	Ремонт на локални деформации, дупки, коловози и слягане на пътната настилка	м ²	339.90	190.83	64.863.12
4	Ремонт на значителни деформации, дупки, коловози и слягане на пътната настилка с дълбочина над 50 мм.	м ²	102.30	250.84	25.660.93
5	Ремонт и повдигане на стените на съществуващи ревизионни шахти на отводнителни системи и казанчета на водостоци	бр	2.64	71.81	189.58
6	Ремонт и повдигане на съществуващи и направа на нови тротоари	м ²	990.00	23.68	23.443.20
7	Ремонт и възстановяване на съществуваща единична предпазна ограда	м	99.00	35.09	3.473.91
8	Ремонт и възстановяване на съществуваща вертикална сигнализация	м ²	13.20	179.47	2.369.00
III. Пътни работи					
1	Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон (биндер) за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина.	т	31.35	144.73	4.537.29
2	Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон за ремонт на дупки с различна дебелина и широчина	т	34.65	156.83	5.434.16
3	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип А с дебелина след уплътняване 4 см.	м ²	14.355.00	21.63	310.498.65
4	Направа на битумен разлив за връзка	м ²	16,005.00	1.77	28,328.85
5	Доставка и полагане на бетонови бордюри 18/35, включително всички свързани с това разходи	м	330.00	22.54	7.438.20
6	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка без перли, включително всички свързани с това разходи	м ²	1,221.00	9.94	12.136.74
7	Доставка и монтаж на стандартни рефлектиращи пътни знаци, включително всички свързани с това разходи	м ²	5.94	197.42	1.172.67
IV. Ремонтни работи при водостоци и големи съоръжения					
1	Разваляне на съществуваща пътна настилка, включително натоварване, превоз и разтоварване на депо	м ³	19.80	17.40	344.52
2	Ремонт и възстановяване на съществуващи парапети с височина 1.10 м.	м	9.90	17.65	174.74
3	Почистване на втока и оттока на съоръжението и радието, включително разчистване на терена и растителността	м ³	3.30	35.74	117.94
II. ОБЕКТ: Реконструкция на път гр. Брацигово - с. Капитан Димитриево					536,084.04
III. ОБЕКТ: Реконструкция на селищна водопроводна мрежа на с. Равногор, община Брацигово					
Строителна част					

X/10
4

	Направа на изкоп с ширина 0.73-1.59 м и дълбочина до 1.73 м в скални				
1	- машинен 80%	м ³	19214	5.38	103.371.32
	- ръчен 20%	м ³	4803	58.80	282.416.40
2	Прехвърляне на земни маси до 2.0 м вертикално и 3.0 м хоризонтално	м ³	24017	10.98	263.706.66
	Разриване и подравняване на земни маси				
3	- булдозер 80%	м ³	19214	1.80	34.585.20
	- ръчно 20%	м ³	4803	9.53	45.772.59
4	Подравняване и уплътняване дъното на изкопа	м ²	12143	2.22	26.957.46
5	Подложка от пясък с дебелина 10 см и до 20 см над темето на тръбата	м ³	6816	34.02	231.880.32
	Обратно засипване на пластове през 20 см				
6	- ръчно уплътняване около тръбата	м ³	6816	7.40	50.438.40
	- машинно и пневм.трамбовка	м ³	21480	1.95	41.886.00
7	Направа на временно мостче за преминаване на пешеходци	бр.	4	67.06	268.24
8	Баластра речна за пътни основи с валиране	м ³	8131	31.24	254.012.44
9	Битумизирана баластра - 6 см	м ³	1435	252.28	362.021.80
10	Асфалтобетон - плътен БДС 4132-90 с дебелина 6 см	т	3444	164.08	565.091.52
11	Пръскане с емулсия между плътния асфалтобетон и битумизираната баластра	м ²	23916	1.81	43.287.96
12	Бетонна основа за бордюри	м ³	100	111.46	11.146.00
13	Монтаж на бордюри бетонни БДС 624-87-25/10/50 при СВО	м	590	20.73	12.230.70
14	Направа на плочници и тротоари с бетонови плочи при СВО	м ²	885	33.42	29.576.70
15	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка. изкоп с тов. машина и тов. самосвал	м ³	1005	14.78	14.853.90
16	Демонтаж на тротоар от базалтови плочи за изграждане на СВО, натоварване ръчно на самосвал и превоз на депо	м ²	885	12.56	11.115.60
17	Разваляне на съществуваща трошенокаменна настилка включително натоварване и превоз -0.35 м	м ³	8371	5.35	44.784.85
18	Натоварване и извозване на строителни отпадъци - 10 km	м ³ /км	10261	6.13	62.899.93
	Монтажна част				
1	Доставка, полагане и монтаж на тръба ф90 PE100 PN10	м'	13201	10.48	138.346.48
2	Доставка, полагане и монтаж на тръба ф110 PE100 PN10	м'	730	14.47	10.563.10

XIN

3	Доставка, полагане и монтаж на тръба ф125 PE100 PN10	м'	1022	17.56	17.946.32
4	Доставка, полагане и монтаж на тръба ф25 PE80 PN10	м'	3540	2.94	10.407.60
5	Доставка и монтаж на тройник 90° Т ф90/ф90/ф90 PE100 PN10	бр.	137	51.87	7.106.19
6	Доставка и монтаж на тройник 90° Т ф110/ф110/ф110 PE100 PN10	бр.	1	68.58	68.58
7	Доставка и монтаж на тройник 90° Т ф125/ф125/ф125 PE100 PN10	бр.	5	80.47	402.35
8	Доставка и монтаж на тройник намалител 90° Т ф110/ф90/ф110 PE100 PN10	бр.	11	77.98	857.78
9	Доставка и монтаж на тройник намалител 90° Т ф125/ф90/ф125 PE100 PN10	бр.	12	109.06	1.308.72
10	Доставка и монтаж на намалител ф125/ф110 PE100 PN10	бр.	1	46.36	46.36
11	Доставка и монтаж на намалител ф125/ф90 PE100 PN10	бр.	6	40.99	245.94
12	Доставка и монтаж на намалител ф110/ф90 PE100 PN10	бр.	3	32.29	96.87
13	Доставка и монтаж на дъга 11.25° ф90/ф90	бр.	77	30.44	2.343.88
14	Доставка и монтаж на дъга 11.25° ф110/ф110	бр.	3	36.26	108.78
15	Доставка и монтаж на дъга 11.25° ф125/ф125	бр.	7	40.00	280.00
16	Доставка и монтаж на дъга 22.5° ф90/ф90	бр.	61	35.78	2.182.58
17	Доставка и монтаж на дъга 22.5° ф110/ф110	бр.	1	36.26	36.26
18	Доставка и монтаж на дъга 22.5° ф125/ф125	бр.	5	40.00	200.00
19	Доставка и монтаж на дъга 30° ф90/ф90	бр.	22	35.78	787.16
20	Доставка и монтаж на дъга 30° ф110/ф110	бр.	2	36.26	72.52
21	Доставка и монтаж на дъга 30° ф125/ф125	бр.	1	40.00	40.00
22	Доставка и монтаж на коляно 45° ф90/ф90	бр.	32	33.81	1.081.92
23	Доставка и монтаж на коляно 45° ф110/ф110	бр.	1	41.03	41.03
24	Доставка и монтаж на коляно 45° ф125/ф125	бр.	1	52.41	52.41
25	Доставка и монтаж на дъга 60° ф90/ф90	бр.	4	37.87	151.48
26	Доставка и монтаж на коляно 90° ф90/ф90	бр.	4	28.11	112.44
27	Доставка и монтаж на кръстач 90° Т ф90/ф90/ф90/ф90 PE100 PN10	бр.	14	69.56	973.84
28	Доставка и монтаж на кръстач 90° Т ф110/ф110/ф110/ф110 PE100 PN10	бр.	1	114.53	114.53
29	Доставка и монтаж на кръстач 90° Т ф125/ф125/ф125/ф125 PE100 PN10	бр.	1	111.85	111.85
30	Доставка и монтаж тапа ф90	бр.	20	43.09	861.80
31	Доставка и монтаж тапа ф110	бр.	1	50.84	50.84
32	Доставка и монтаж тапа ф125	бр.	1	56.98	56.98
33	Доставка и монтаж на предфланшова връзка ф90 PE100 PN10	бр.	255	26.01	6.632.55
34	Доставка и монтаж на предфланшова връзка ф110 PE100 PN10	бр.	4	30.54	122.16
35	Доставка и монтаж на предфланшова връзка ф125 PE100 PN10	бр.	4	33.59	134.36
36	Доставка и монтаж на СК ф80 шибърен чугун с охранителна гарнитура	бр.	96	221.17	21.232.32
37	Доставка и монтаж на СК ф100 шибърен чугун с охранителна гарнитура	бр.	2	64.33	128.66
38	Доставка и монтаж на СК ф125 шибърен чугун с охранителна гарнитура	бр.	2	315.86	631.72
39	Доставка и монтаж на ПХ 70/80 надземен комплект с пета	бр.	63	402.46	25.354.98
40	Доставка и монтаж на коляно фланшово 90° ф90/ф90	бр.	63	33.81	2.130.03
41	Доставка и монтаж на водовземна скоба PE ф90-ф25mm	бр.	590	15.82	9.333.80
42	Доставка и монтаж на преход външна резба ф25-3/4"	бр.	1770	6.37	11.274.90
43	Доставка и монтаж на ТСК Ф3/4" с охранителна гарнитура	бр.	590	123.56	72.900.40
44	Направа на бетонови опорни блокове	бр.	629	96.00	60.384.00
45	Доставка и монтаж на сигнална лента "ВОДОПРОВОД"	м'	18493	0.25	4.623.25
46	Доставка и монтаж на сигнална лента с метална нишка	м'	18493	0.57	10.541.01
47	Доставка и монтаж на табели за СК	бр.	37	71.22	2.635.14
48	Доставка и монтаж на табели за ПХ	бр.	63	71.22	4.486.86
49	Доставка и монтаж на шахта за изпразнител	бр.	28	595.22	16.666.16
50	Доставка и монтаж на шахта за въздушник	бр.	34	595.22	20.237.48
51	Доставка и монтаж на автоматичен въздушник ф2"(DN50)	бр.	34	199.00	6.766.00

XIO

52	Изпитване на водопровода	м'	18493	1.61	29.773.73
53	Дезинфекция на водопровода	100 м'	184.93	19.01	3.515.52
54	Пътни знаци, сигнализация и предпазни огради	бр.	20	158.05	3.161.00
III. ОБЕКТ: Реконструкция на селищна водопроводна мрежа на с.					3,002,026.61
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА СМР:					4,243,665.53
НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ ДО 5 %:					212,183.28
ОБЩА СТОЙНОСТ ВКЛ. НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ:					4,455,848.81
ДДС 20%:					891,169.76
ОБЩА СТОЙНОСТ С ДДС:					5,347,018.57

Дата: 12.08.2013г.

Управител: 
/инж. Халина Малецка - Пейчева/



XI

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на път гр. Брацигово – с. Капитан Димитриево, реконструкция на селищна водопроводна мрежа на с. Равногор и реконструкция на водопроводи от подземни каптажи – „Замарница“, „Попски извор“, „Бойков извор“, „Розовски вриз“ и „Чобаново“ до РЩ Розово, община Брацигово, област Пазарджик”

ОБРАЗЕЦ № 18

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

„Тракия - РМ” ЕООД

(наименование на участника)

и подписано от

Халина Малецка – Пейчева ЕГН 5610050870

(трите имена и ЕГН)

в качеството му на

Управител

(на длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в процедурата, получаването на които потвърждаваме с настоящото, ние удостоверяваме и потвърждаваме, че представляваният от нас участник отговаря на изискванията и условията посочени в документацията за участие в процедурата.

Декларираме, че сме закупили документация за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Въз основа на огледа на обекта и данните от техническата спецификация и проекта изготвихме Работна програма, в която са разработени следните въпроси/части: Стратегия за изпълнение на договора, Анализ на рисковете, Организационен план и Технология за изпълнение на строителството. Представената от нас Работна програма посочва възможностите ни да осигурим качеството на изпълнение и постигането на изискванията на Възложителя.

С подаване на настоящата оферта декларираме, че сме съгласни валидността на нашата оферта да бъде 180 календарни дни, считано от крайния срок за получаване на оферти, посочен в обявлението за процедурата.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор по приложения в документацията образец.

Предлагаме срок за изпълнение на поръчката 180 /сто и осемдесет/ календарни дни, съгласно Линейния график и Работната програма, които са приложени към офертата.

Предлагаме следните **гаранционни срокове** за отделните видове строително-ремонтни работи, както следва:

- Реконструкция на водопроводи от подземни каптажи – 8 години;
- Реконструкция на път гр. Брацигово - с. Капитан Димитриево – 3 години;
- Реконструкция на селищна водопроводна мрежа на с. Равногор – 8 години.

Приложения:

- Работна програма;
- Линейен график и Диаграма на работната ръка.


Дата, 19.08.2013г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:



A large, stylized handwritten signature in black ink.

A large, stylized handwritten signature in black ink.



ДО
ОБЩИНА БРАЦИГОВО
УЛ. "АТАНАС КАБОВ" №6А
ГР. БРАЦИГОВО

Гр. София, 13 декември 2014г.

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ
L/G01000852/13.12.2014г.

Ние, „Българо-американска кредитна банка“ АД, гр.София, вписана в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията под единен идентификационен код (ЕИК): 121246419, регистрирана по фирмено дело №12587/1996г., със седалище и адрес на управление в гр.София 1000, район "Средец", ул."Славянска" №2, представлявана от Изпълнителния директор Васил Стефанов Симов, ЕГН:5812046921 и Силвия Кирилова Кирилова, ЕГН:7111096510, действаща като пълномощник съгласно пълномощно с нотариална заверка на подписите под рег.№494/27.01.2014г. и със заверка на съдържанието под рег.№495/27.01.2014г., том 1, акт 45 по описа на нотариус Мария Михова - Рашкова, рег.№504 на Нотариалната камара, на Изпълнителните директори Васил Стефанов Симов, ЕГН:5812046921 и Таня Илиева Керемидчиева, ЕГН:5311186896, сме уведомени, че нашият клиент - "ТРАКИЯ – РМ" ЕООД, с ЕИК: 115010446, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул."Братя Бъкстон" №136, представлявано от управителя Халина Малецка - Пейчева, е определен за Изпълнител в открита процедура по ЗОП с предмет: „Реконструкция на път гр.Брацигово – с.Капитан Димитриево, реконструкция на селищна водопроводна мрежа на с. Равногор и реконструкция на водопроводи от подземни каптажи – „Замарница“, „Попски извор“, „Бойков извор“, „Розовски вриз“ и „Чобаново“ до РШ Розово, община Брацигово; област Пазарджик“.

Също така сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона за обществените поръчки, определеният за Изпълнител участник - "ТРАКИЯ – РМ" ЕООД, ЕИК: 115010446, при подписване на Договора за обществена поръчка трябва да представи на Община Брацигово, като Възложител, банкова гаранция за добро изпълнение, открита в полза на ОБЩИНА БРАЦИГОВО, с адрес ул."Атанас Кабов" №6А, гр.Брацигово, община Брацигово, област Пазарджик, за сума в общ размер на **133 675,47 лв.** (сто тридесет и три хиляди шестстотин седемдесет и пет лева и четиридесет и седем стотинки), с която да гарантира изпълнението на задълженията си съобразно разпоредбите на Договора за обществена поръчка и на българското законодателство.

С оглед изложеното, ние „Българо-американска кредитна банка“ АД, гр. София, с настоящото се задължаваме неотменимо и безусловно да заплатим по посочена от Вас банкова сметка сумата в размер до **69 485,47 лв.** (шестдесет и девет хиляди четиристотин осемдесет и пет лева и четиридесет и седем стотинки), при получаване на Вашето първо надлежно подписано и подпечатано писмено искане за плащане, деклариращо че Изпълнителят и наш клиент - "ТРАКИЯ – РМ" ЕООД не е изпълнил частично или изцяло някое от договорните си задължения по Договора за обществена поръчка. За остатъка от сумата, посочена в предходния параграф, „Българо-американска кредитна банка“ АД издава Банкова гаранция за добро изпълнение № L/G01000851/13.12.2014г.

Всяко плащане по тази гаранция от страна на „Българо-американска кредитна банка“ АД, София, намалява ангажимента на банката с размера на платената сума.

Вашето писмено искане за плащане по гаранцията трябва да ни бъде представено посредством централата на обслужващата Ви местна банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона.

Плащането ще бъде извършено без възражения или съдебни процедури от какъвто и да било вид, веднага след получаване на Вашето надлежно подписано и подпечатано писмено искане за плащане,

ПЪЛНОМОЩНО

от името на
“БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА” АД (БАКБ), вписана в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията с ЕИК 121246419, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. „Славянска“ № 2

Долуподписаните, **ВАСИЛ СТЕФАНОВ СИМОВ**, ЕГН 5812046921, с постоянен адрес гр. София, лична карта № 640311173, издадена на 23.06.2010 г. от МВР – гр.София и **ТАНЯ ИЛИЕВА КЕРЕМИДЧИЕВА**, ЕГН 5311186896, с постоянен адрес гр. София, лична карта № 641047234, издадена на 30.09.2010 г. от МВР – гр.София, в качеството си на Изпълнителни директори на **БАКБ АД**,

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

СИЛВИЯ КИРИЛОВА КИРИЛОВА, с постоянен адрес: гр. София, ЕГН 7111096510, лична карта № 644616585, издадена на 22.02.2013 г. от МВР-София

ВИНАГИ ЗАЕДНО С ВСЕКИ ЕДИН ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ ДИРЕКТОРИ

СЪС СЛЕДНИТЕ ПРАВА:

- I. Да подписва всякакви документи и да извършват правни и фактически действия, необходими за:
 1. сключване и подписване от името и за сметка на „Българо-американска кредитна банка“ АД (БАКБ) на договори за предоставяне и получаване/ползване на кредити и анекси към тях, както и анекси към вече сключени договори за предоставяне или получаване/ползване на кредити;
 2. учредяване от името и за сметка на БАКБ на всякакъв вид обезпечения (залози, особени залози, поръчителства и др.) за обезпечаване на задължения на БАКБ, произтичащи от сключени договори за ползване на кредит, договори за банкова кредитна линия, договори за издаване на банкова гаранция и/или анекси към тях, както и подписване на необходимите документи за подновяване на вписването на законни/ договорни ипотеки и договори за залог, преди изтичане на законния срок на действие на вписването;
 3. сключване и подписване от името и за сметка на БАКБ на договори за издаване на банкови гаранции, включително подписване от името и за сметка на БАКБ на банкови гаранции, издавани въз основа на и при условията на сключени договори за издаване на банкова гаранция;
 4. сключване от името и за сметка на БАКБ на договори за издаване на акредитиви и издаване на акредитиви въз основа на сключените договори;
 5. сключване и подписване от името и за сметка на БАКБ на договори за новация, прехвърляне на вземане, приемане на нов съдължник или нов длъжник, встъпване и/или заместване в дълг, включително с лице, което той също представлява;
 6. сключване и подписване от името и за сметка на БАКБ на договори за специални банкови сметки (сметки, които се обслужват при определени с договор условия), във връзка с осъществяването на банкова дейност по извършване на банкови сделки;
 7. сключване от името и за сметка на БАКБ на договори за лизинг и подписване на всякакви други документи, свързани с тях, като за целта упълномощеното лице има право да представлява БАКБ пред физически и юридически лица, нотариус, ЦРОЗ, Агенция по вписванията и други органи/институции;
 8. подписване на проспекти за публично предлагане, меморандуми за частно предлагане и всякакви други документи във връзка със сключване на облигационни заеми от БАКБ и издаване

СОФИЯ 1000
ул. Славянска №2
02 9658 358
02 9658 377
Факс: 02 9445 010

СОФИЯ 1000
ул. Раковски №193
02 9658 243
02 9658 244
Факс: 02 9811 330

ВАРНА 9000
Бул. Сливница №93
052 684 421 28
052 684 410 13
Факс: 052 584 414

ПЛОВДИВ 4000
ул. Белград №6
032 901 740 44
032 901 750 52
Факс: 032 962 213

СТАРА ЗАГОРА 6000
Бул. Руски №6
042 610 211
042 610 212
Факс: 042 600 827



БУРГАС 8000
ул. Фердинандова №57
056 589 504
Факс: 056 589 507

Вярно е
ПОДПИСАНО

на всякакви видове емисии облигации от БАКБ, както и подписване на документи за обезпечаване на тези задължения;

9. сключване и подписване на всякакви документи и да извършване на правни и фактически действия, необходими за сключване и подписване от името и за сметка на БАКБ на договори за наем на придобити от БАКБ недвижими имоти с наематели и при цени и условия по договорите за наем, съгласно решение на Управителния съвет на БАКБ, както и договори за посредничество за продажба, респ. за отдаване под наем на собствени на БАКБ недвижими имоти, както и на договори за охрана, договори за ремонт и СМР на придобити от БАКБ недвижими имоти със съконтрахенти и при цени и условия, съгласно одобреното от съответните компетентни органи на БАКБ, както и да сключва и подписва анекси към вече сключени договори.

10. сключване и подписване от името и за сметка на БАКБ на договори със съконтрахенти, доставчици, експлоатационни дружества, както и с други физически и юридически лица, свързани с осъществяване на дейността на БАКБ без ограничения в предмета, условията и срока на действие на договорите, както и да сключва и подписва анекси към вече сключени договори.

II. Да одобрява и /или подписва от името и за сметка на БАКБ посочените по-долу действия:

1. разпореждане със средства по банкови сметки, открити на името на БАКБ в търговски банки в страната и чужбина и
2. разходи, свързани с дейността на БАКБ.


III. Да подписва от името и за сметка на БАКБ банкови референции, удостоверения, уведомления, писма и друга кореспонденция с клиенти на БАКБ, както и да представлява БАКБ пред всички физически и юридически лица, Българска народна банка, Министерство на финансите, ДАНС, Централен депозитар АД, Българска фондова борса-София АД, Комисия за финансов надзор, Агенция по вписванията - Търговски регистър и Имотен регистър, Агенция по геодезия, картография и кадастър, Централен регистър на особените залози, както и пред всички държавни и общински органи, съдилища и други правораздавателни органи, данъчни органи, органи на НОИ, органи на КАТ, Комисията за установяване на имущество придобито по престъпна дейност /КУИППД/, Националната агенция по приходите /НАП/, службите на Министерството на вътрешните работи /МВР/, Национална следствена служба /НСС/, Комисия за защита на конкуренцията, Комисия за защита на личните данни и други държавни и общински органи и др., във връзка с осъществяване на дейността на банката, както и да подписва, получава и изпраща справки, отчети, декларации, заявления и всякаква кореспонденция и други документи, свързани с отношенията на БАКБ с посочените органи и лица.

IV. Да подписва извлечения от счетоводните книги на БАКБ АД, издадени на основание чл. 60, ал. 2 от ЗКИ и чл. 417, т. 2 от ГПК (извлечения от сметките), с които се установяват вземания на БАКБ АД, произтичащи от сключени договори с нейни длъжници, необходими за издаване на заповеди за изпълнение и издаване на изпълнителни листа.

Това пълномощно е валидно до 30 януари 2015 г. включително и правата по него могат да се упражняват неограничен брой пъти за срока на неговата валидност.


Упълномощители:


Васил Гedefов Симов
Изпълнителен директор


Ивана Илиева
Изпълнителен директор

Вярно с
оригинала





ДО
ОБЩИНА БРАЦИГОВО
УЛ. "АТАНАС КАБОВ" №6А
ГР. БРАЦИГОВО

Гр. София, 13 декември 2014г.

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ
L/G01000851/13.12.2014г.

Ние, „Българо-американска кредитна банка“ АД, гр.София, вписана в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията под единен идентификационен код (ЕИК): 121246419, регистрирана по фирмено дело №12587/1996г., със седалище и адрес на управление в гр.София 1000, район "Средец", ул."Славянска" №2, представлявана от Изпълнителния директор Васил Стефанов Симов, ЕГН:5812046921 и Силвия Кирилова Кирилова, ЕГН:7111096510, действаща като пълномощник съгласно пълномощно с нотариална заверка на подписите под рег.№494/27.01.2014г. и със заверка на съдържанието под рег.№495/27.01.2014г., том 1, акт 45 по описа на нотариус Мария Михова - Рашкова, рег.№504 на Нотариалната камара, на Изпълнителните директори Васил Стефанов Симов, ЕГН:5812046921 и Таня Илиева Керемидчиева, ЕГН:5311186896, сме уведомени, че нашият клиент - "ТРАКИЯ – РМ" ЕООД, с ЕИК: 115010446, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул."Братя Бъкстон" №136, представлявано от управителя Халина Малецка - Пейчева, е определен за **Изпълнител** в открита процедура по ЗОП с предмет: „Реконструкция на път гр.Брацигово – с.Капитан Димитриево, реконструкция на селищна водопроводна мрежа на с. Равногор и реконструкция на водопроводи от подземни каптажи – „Замарница“, „Попски извор“, „Бойков извор“, „Розовски вриз“ и „Чобаново“ до РШ Розово, община Брацигово, област Пазарджик“.

Също така сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона за обществените поръчки, определеният за **Изпълнител** участник - "ТРАКИЯ – РМ" ЕООД, ЕИК: 115010446, при подписване на Договора за обществена поръчка трябва да представи на Община Брацигово, като Възложител, банкова гаранция за добро изпълнение, открита в полза на **ОБЩИНА БРАЦИГОВО**, с адрес ул."Атанас Кабов" №6А, гр.Брацигово, община Брацигово, област Пазарджик, за сума в общ размер на **133 675,47 лв.** (сто тридесет и три хиляди шестстотин седемдесет и пет лева и четиридесет и седем стотинки), с която да гарантира изпълнението на задълженията си съобразно разпоредбите на Договора за обществена поръчка и на българското законодателство.

С оглед изложеното, ние „Българо-американска кредитна банка“ АД, гр. София, с настоящото се задължаваме неотменимо и безусловно да заплатим по посочена от Вас банкова сметка сумата в размер до **64 190,00 лв.** (шестдесет и четири хиляди сто и деветдесет лева), при получаване на Вашето първо надлежно подписано и подпечатано писмено искане за плащане, деклариращо че Изпълнителят и наш клиент - "ТРАКИЯ – РМ" ЕООД не е изпълнил частично или изцяло някое от договорните си задължения по Договора за обществена поръчка. За остатъка от сумата, посочена в предходния параграф, „Българо-американска кредитна банка“ АД издава Банкова гаранция за добро изпълнение № L/G01000852/13.12.2014г.

Всяко плащане по тази гаранция от страна на „Българо-американска кредитна банка“ АД, София, намалява ангажимента на банката с размера на платената сума.

Вашето писмено искане за плащане по гаранцията трябва да ни бъде представено посредством централата на обслужващата Ви местна банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона.

Плащането ще бъде извършено без възражения или съдебни процедури от какъвто и да било вид, веднага след получаване на Вашето надлежно подписано и подпечатано писмено искане за плащане,

ПЪЛНОМОЩНО

от името на

“БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА” АД (БАКБ), вписана в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията с ЕИК 121246419, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. „Славянска“ № 2

Долуподписаните, **ВАСИЛ СТЕФАНОВ СИМОВ**, ЕГН 5812046921, с постоянен адрес гр. София, лична карта № 640311173, издадена на 23.06.2010 г. от МВР – гр.София и **ТАНЯ ИЛИЕВА КЕРЕМИДЧИЕВА**, ЕГН 5311186896, с постоянен адрес гр. София, лична карта № 641047234, издадена на 30.09.2010 г. от МВР – гр.София, в качеството си на Изпълнителни директори на БАКБ АД,

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

СИЛВИЯ КИРИЛОВА КИРИЛОВА, с постоянен адрес: гр. София, ЕГН 7111096510, лична карта № 644616585, издадена на 22.02.2013 г. от МВР-София

ВИНАГИ ЗАЕДНО С ВСЕКИ ЕДИН ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ ДИРЕКТОРИ

СЪС СЛЕДНИТЕ ПРАВА:

- I. Да подписва всякакви документи и да извършват правни и фактически действия, необходими за:
 1. сключване и подписване от името и за сметка на „Българо-американска кредитна банка“ АД (БАКБ) на договори за предоставяне и получаване/ползване на кредити и анекси към тях, както и анекси към вече сключени договори за предоставяне или получаване/ползване на кредити;
 2. учредяване от името и за сметка на БАКБ на всякакъв вид обезпечения (залози, особени залози, поръчителства и др.) за обезпечаване на задължения на БАКБ, произтичащи от сключени договори за ползване на кредит, договори за банкова кредитна линия, договори за издаване на банкова гаранция и/или анекси към тях, както и подписване на необходимите документи за подновяване на вписването на законни/ договорни ипотечи и договори за залог, преди изтичане на законния срок на действие на вписването;
 3. сключване и подписване от името и за сметка на БАКБ на договори за издаване на банкови гаранции, включително подписване от името и за сметка на БАКБ на банкови гаранции, издавани въз основа на и при условията на сключени договори за издаване на банкова гаранция;
 4. сключване от името и за сметка на БАКБ на договори за издаване на акредитиви и издаване на акредитиви въз основа на сключените договори;
 5. сключване и подписване от името и за сметка на БАКБ на договори за новация, прехвърляне на вземане, приемане на нов съдължник или нов длъжник, встъпване и/или заместване в дълг, включително с лице, което той също представлява;
 6. сключване и подписване от името и за сметка на БАКБ на договори за специални банкови сметки (сметки, които се обслужват при определени с договор условия), във връзка с осъществяването на банкова дейност по извършване на банкови сделки;
 7. сключване от името и за сметка на БАКБ на договори за лизинг и подписване на всякакви други документи, свързани с тях, като за целта упълномощеното лице има право да представлява БАКБ пред физически и юридически лица, нотариус, ЦРОЗ, Агенция по вписванията и други органи/институции;
 8. подписване на проспекти за публично предлагане, меморандуми за частно предлагане и всякакви други документи във връзка със сключване на облигационни заеми от БАКБ и издаване

СОФИЯ 1000
ул. Славянска №2
02 9658 358
02 9658 377
Факс: 02 9445 010

СОФИЯ 1000
ул. Раковски №193
02 9658 243
02 9658 244
Факс: 02 9801 330

ВАРНА 9000
бул. Сливница №93
052 684 421 28
052 684 410 13
Факс: 052 684 414

ПЛОВДИВ 4000
ул. Белград №6
032 901 740 44
032 901 750 52
Факс: 032 952 213

СТАРА ЗАГОРА 6000
бул. Руски №6
042 610 211
042 610 212
Факс: 042 600 827



Вярно с
оригинала

на всякакви видове емисии облигации от БАКБ, както и подписване на документи за обезпечаване на тези задължения;

9. сключване и подписване на всякакви документи и да извършване на правни и фактически действия, необходими за сключване и подписване от името и за сметка на БАКБ на договори за наем на придобити от БАКБ недвижими имоти с наематели и при цени и условия по договорите за наем, съгласно решение на Управителния съвет на БАКБ, както и договори за посредничество за продажба, респ. за отдаване под наем на собствени на БАКБ недвижими имоти, както и на договори за охрана, договори за ремонт и СМР на придобити от БАКБ недвижими имоти със съконтрахенти и при цени и условия, съгласно одобреното от съответните компетентни органи на БАКБ, както и да сключва и подписва анекси към вече сключени договори.

10. сключване и подписване от името и за сметка на БАКБ на договори със съконтрахенти, доставчици, експлоатационни дружества, както и с други физически и юридически лица, свързани с осъществяване на дейността на БАКБ без ограничения в предмета, условията и срока на действие на договорите, както и да сключва и подписва анекси към вече сключени договори.

II. Да одобрява и /или подписва от името и за сметка на БАКБ посочените по-долу действия:

1. разпореждане със средства по банкови сметки, открити на името на БАКБ в търговски банки в страната и чужбина и
2. разходи, свързани с дейността на БАКБ.


III. Да подписва от името и за сметка на БАКБ банкови референции, удостоверения, уведомления, писма и друга кореспонденция с клиенти на БАКБ, както и да представлява БАКБ пред всички физически и юридически лица, Българска народна банка, Министерство на финансите, ДАНС, Централен депозитар АД, Българска фондова борса-София АД, Комисия за финансов надзор, Агенция по вписванията – Търговски регистър и Имотен регистър, Агенция по геодезия, картография и кадастър, Централен регистър на особените залози, както и пред всички държавни и общински органи, съдилища и други правораздавателни органи, данъчни органи, органи на НОИ, органи на КАТ, Комисията за установяване на имущество придобито по престъпна дейност /КУИППД/, Националната агенция по приходите /НАП/, службите на Министерството на вътрешните работи /МВР/, Национална следствена служба /НСС/, Комисия за защита на конкуренцията, Комисия за защита на личните данни и други държавни и общински органи и др., във връзка с осъществяване на дейността на банката, както и да подписва, получава и изпраща справки, отчети, декларации, заявления и всякаква кореспонденция и други документи, свързани с отношенията на БАКБ с посочените органи и лица.

IV. Да подписва извлечения от счетоводните книги на БАКБ АД, издадени на основание чл. 60, ал. 2 от ЗКИ и чл. 417, т. 2 от ГПК (извлечения от сметките), с които се установяват вземания на БАКБ АД, произтичащи от сключени договори с нейни длъжници, необходими за издаване на заповеди за изпълнение и издаване на изпълнителни листа.

Това пълномощно е валидно до 30 януари 2015 г. включително и правата по него могат да се упражняват неограничен брой пъти за срока на неговата валидност.

Упълномощители:


Васил Георгиев
Изпълнителен директор


Илиана Иванова
Изпълнителен директор

Ивано
Иванова





Оригинал

Застрахователна полица № 14001P10007

Застрахователна компания "УНИКА" АД, срещу заплащане на застрахователна премия, се съгласява да застрахова интереси по начин и при условия, посочени в полицата.


- Вид застраховка: Професионална отговорност на лицата по чл. 171 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
- Застрахован: "ТРАКИЯ РМ" ЕООД
ул. "Братя Бъкстон" №36
гр. Пловдив
- Застрахован интерес: Професионалната отговорност на застрахования по чл. 171 от ЗУТ като строител за цялостно изпълнение на строителството или на отделни видове строителни и монтажни работи за строежи от първа до пета категория за всички групи.

Ретроактивна дата по чл. 172, ал. 1, т. 2 от ЗУТ – датата на започване на горепосочената дейност на застрахования. Ако застрахованият е упражнявал тази дейност повече от пет години, ретроактивната дата е пет години преди датата на сключване на тази полица.
- Срок на застраховката: от 29.04.2014 год.
до 28.04.2015 год.
- Застрахователна сума: Отговорността на застрахователя по писмени претенции за вреди от горепосочената дейност на застрахования е ограничена до BGN 300 000 (триста хиляди) за едно застрахователно събитие и до BGN 600 000 (шестстотин хиляди) в агрегат (с натрупване) за всички събития, настъпили в срока на застраховката.

Годишна застрахователна сума: BGN 600 000 (шестстотин хиляди).
- Условия: Съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.
- Застрахователна премия: Общо премия – 600.00 BGN
Данък върху застрахователните премии по "ЗДЗП (2%) – 12.00 BGN
Общо дължимата сума – 612.00 (шестстотин и дванадесет) BGN

Дължимата сума е платима на четири разсрочени вноски с размер и срок на плащане, както следва:

Вид вноски	Премия в лева	Данък по ДЗДП (2%) в лева	Общо дължимата премия в лева	Срок на плащане
Първа	150.00	3.00	153.00	28.04.2014



Застрахователна компания "УНИКА" АД
Соня 1612, ул. "Оряк" № 11-13
тел: (02) 9136 133, факс: (02) 9136 100
www.uniga.bg

ЕИК: 04043383
IBAN: BG16 2200 4103 1000 3001 28
BIC: UNIGBG33
Регистър: 04043383

Втора	150.00	3.00	153.00	28.07.2014
Трета	150.00	3.00	153.00	28.10.2014
Четвърта	150.00	3.00	153.00	28.01.2015

Застрахователят предупреждава, на основание чл. 202 от Кодекса за застраховането, че при неплащане на разсрочена вноска в срока, посочен по-горе, застраховката се прекратява след изтичане на 15 (петнадесет) дни от този срок.

В посочения по-горе срок на плащане дължимата застрахователна премия следва да бъде платена в брой или преседена по сметка:

IBAN: BG16 RZBB 9155 1000 3008 38, BIC: RZBBBGSF
 „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД
 *ЗДЗП – Закон за данък върху застрахователните премии

- Специални условия: Спорове между страните по договори за застраховка, сключени по тези Общи условия, се решават чрез преговори, а при непостигане на съгласие – от Софийски районен съд, съответно Софийски градски съд.
- Самоучастие: Застрахованият ще участва за своя сметка с 10%, но не по-малко от BGN 1 000 (хиляда) от всяко обезщетение по всяко едно събитие.
- Териториална валидност: Европейски съюз

Подписаният застрахован/представител на застрахования декларирам:

1. Предоставена ми е информация като потребител на застрахователни услуги.
2. Съгласен съм ЗК „Уника“ АД да обработва личните ми данни, както и данните за лицата, обявени в полицата, съгласно Закона за личните данни.
4. Не възразявам вписаните в полицата данни да бъдат ползвани от ЗК „Уника“ АД за кореспонденция при предлагане на продукти.

Тази полица е издадена съгласно писмено предложение на застрахования, съставляващо неразделна част от застрахователния договор.

Дата на предложението: 02.04.2014 год.


Полицата е издадена в 1 (един) оригинален екземпляр.
02.04.2014 год.

Издадена от: Василка Вильова

Застрахован/Представител на застрахования:

Име: _____

Подпис: _____

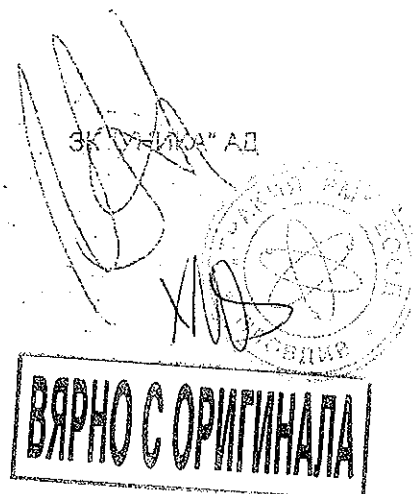

Застрахователна полица № 580003301514

Застрахователна компания "УНИКА Живот" АД с ЕИК 831626729 и адрес: София, ул. Юнак №11-13, срещу заплащане на застрахователна премия от

• застраховащ / "ТРАКИЯ - РМ" ЕООД ЕИК: 115010446
договорител:

• Адрес: Пловдив, ул. "Братя Бъкстон" 136

се съгласява да застрахова съгласно приложените Общи условия за задължителна застраховка на служителите и работниците за риска "Трудова злополука" - в сила от 10.03.2014 г. Застраховката покрива случаите на трудова злополука по чл.55 ал. 1

• Застраховани лица: 59 лица по списък

• Срок на застраховката: 1 г. Начало: 20.04.2014 г.

Край/Дата на подновяване 19.04.2015 г.

• Застрахователна сума: BGN 3 100 350.88 (три милиона сто хиляди триста и петдесет и 0.88)

Индивидуалните застрахователни суми са посочени в списък, неразделна част от настоящата полица.

• Застрахователна премия: BGN 1 023.12 (хиляда двадесет и три и 0.12)

Данък 2% съгл. ЗДЗП: BGN 20.48 (двадесет и 0.48)

Общо дължима сума : BGN 1 043.60 (хиляда четиридесет и три и 0.60)

• Начин на плащане: Дължимата сума се плаща разсрочено в размер на 260.90 BGN с падеж 20-то число на всеки нов тримесечен период

Съгласно чл.187 от Кодекса за застраховане настоящата полица е невалидна при неплащане на записаната премия или първата дължима вноска от нея до посочената дата на падеж.

На основание чл. 196, ал.2 от Кодекса за застраховане застрахователят Ви информира, че в случай на неплащане на разсрочена вноска до посочената в полицата дата на падеж, полицата ще се счита за прекратена след изтичане на 15 (петнадесет) дни от тази дата, без писмено предизвестие за прекратяването.

Договорителят е длъжен да плаща дължимата сума най-късно до падежа на разсрочената вноска. Договорителят има право да предплаща дължимите за по-дълъг период от време суми.

Дължимите суми се заплащат в левовата им равностойност по курса на БНБ в деня на плащането или директно в евро по банкова сметка на ЗК "УНИКА Живот" АД:

В лева: IBAN BG75RZBB91551000300843 BIC RZBBBGSF

В евро: IBAN BG75RZBB91551467004800 BIC RZBBBGSF

През банкомат чрез В-Рау по кода на ЗК "УНИКА Живот" АД : 61001

През интернет чрез Е-Рау

• Застрахователни покрития:

При смърт на застрахования от трудова злополука, застрахователят изплаща застрахователната сума.

При трайна загуба на работоспособност на застрахования от трудова злополука

застрахователят изплаща такъв процент от застрахователната сума , какъвто е процентът загубена трудоспособност.

При временна неработоспособност на застрахования от трудова злополука, застрахователят изплаща:

- при продължителност над 10 дни до 30 дни - 3 % от месечната брутна работна заплата;
 - при продължителност над 30 дни до 60 дни - 5 % от месечната брутна работна заплата;
 - при продължителност над 60 дни до 120 дни - 7 % от месечната брутна работна заплата;
 - при продължителност над 120 дни - 10 % от месечната брутна работна заплата.
- Специални условия:

- Неразделна част от застрахователната полица е списък съдържащ три имена, ЕГН и брутна работна заплата на всяко от застрахованите лица.

В допълнение на чл.7 и чл. 14 (1) от "Общите условия за задължителна застраховка на работниците и служителите за риска "Трудова злополука"" , изравняването на застрахователната премия се прави един месец преди изтичане на застраховката, като застрахователят/договорител трябва да изпрати актуална справка съдържаща: три имена, ЕГН и брутна работна заплата на застрахованите лица.

- Застрахователят изравнява застрахователната премия при условие, че изменението в размера на общата застрахователната сума в края на договора е над 10% спрямо размера на застрахователната сума съгласно, която е сключен застрахователния договор.

- При увеличение на общата застрахователна сума с над 10% в края на застрахователния договор, Застрахователят начислява допълнителна застрахователна премия. Допълнителната застрахователна премия се начислява за целия период на застраховката и единствено за разликата между общата първоначална застрахователна сума и общата застрахователна сума в края на договора, като се запазва тарифното число, при което е сключен договора.

- При намаление на общата застрахователна сума с над 10% в края на застрахователния договор, Застрахователят дължи връщане на част от застрахователната премия. Дължимата за връщане застрахователна премия се начислява за целия период на застраховката и единствено за разликата между общата застрахователна сума в края на периода и общата първоначална застрахователна сума, като се запазва тарифното число, при което е сключен договора. Застрахователят не дължи връщане на застрахователна премия за лица, за които има настъпили застрахователни събития и са изплатени или предстоят да бъдат изплатени застрахователни обезщетения. Индивидуалните застрахователни суми на тези лица се изваждат от общата застрахователна сума в края на периода на застрахователния договор.

- Ползвачи лица при смърт Законни наследници
- Валидност: За Република България

Долуподписаният застраховач/договорител декларирам, че във връзка със сключването на тази полица:

1. застрахователят ми предостави информацията за потребителите на застрахователни услуги, горните Общи и Специални условия, клаузи и добавъци, с които се запознах, получих и ги приемам;

полица № 580003301514 страница 2/3

Белико Търново
ул "Марно поле" № 9
тел (052) 624 033 621 626, 623

ВАРНО С ОРИГИНАЛА

2. съм съгласен личните ми данни да бъдат използвани, обработвани или предоставяни на трети лица от застрахователя в съответствие със закона.
Тази полица е издадена в два еднообразни екземпляра, по един за двете страни по договора.

Първа тримесечна вноска в размер на :

BGN

Събрана _____ дата _____

Полицата и всички приложения към нея връчени на _____


Тази полица е издадена съгласно писмено предложение на застрахователя/договорител, представляващо неразделна част от Застрахователния договор.

Дата на издаване: 14.04.2014 г.


Подпис на
застрахователя /
договорител:



За ЗК "УНИКА Живот" АД
Агенция Велико Търново



Издадена от: Соня Георгиева



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
